

新クリーンセンター建設状況について

平成 30 年 8 月 2 日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆ 7 月末現在の進捗状況【工事進捗率：3.41%】


【杭工事】工場棟・事務所棟・渡り廊下

5 月 1 日から始まった 現場打ちコンクリート杭（杭径 1 m～2 m、長さ 7.5m～20.5 m）75 本の施工が 7 月 31 日に予定通り完了しました。

また、同時進行している B 工区の山留工事・ごみピット掘削工事、C・D・E 工区の基礎工事についても工程通り順調に進んでいます。

引き続き、環境に配慮し安全、安心な工事の進捗に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

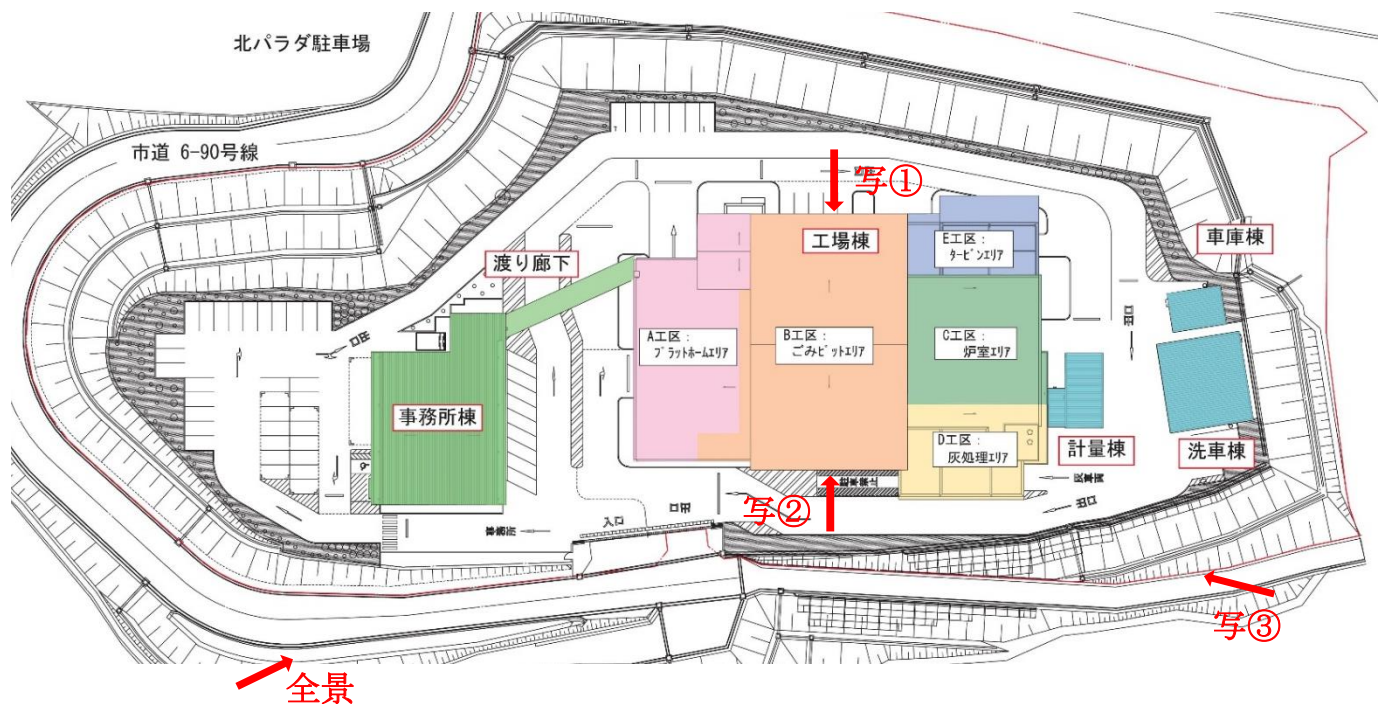

【ドローン撮影：平成 30 年 7 月 31 日】



◆全景写真：平成 30 年 7 月 31 日



◆ごみピットエリア【B 工区】

山留工事・掘削工事：三次掘削、矢板架い込みが終わり約 8m の深さに達し、残り約 2m の掘削となりました。さらに部分的に約 18m の深さまで地盤改良工事を施工していきます。

岩破碎掘削については、強固な岩に難航しながらも予定通り進んでいます。

【写真①】



【写真②】



◆炉室・灰処理・タービン エリア【C・D・E 工区】

基礎工事：杭頭処理、地盤改良、捨てコン、墨だしが終わり、アンカーボルトの設置、地中梁配筋等を進めています。

【写真③】



◆今後の予定【8 月から 9 月】

- ・ B 工区は、地盤改良・ごみピット本体の施工となります。
- ・ C・D・E 工区は、基礎・柱・地中梁配筋等を継続します。
