

新クリーンセンター建設状況について

平成 30 年 10 月 1 日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆ 9 月末現在の進捗状況【工事進捗率：6.5%】


【土木建築工事】工場棟

B 工区（ごみピットエリア）は、掘削工事及び地盤改良工事の施工が終了しました。


また、同時進行している C・D・E 工区は、各工区の基礎工事を行い、地中梁及び C 工区（炉室エリア）のプラント機器の基礎部分となるマットスラブのコンクリート工事が終わり、1 階床部分の作業を進めています。

引き続き、環境に配慮し安全、安心な工事の進捗に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

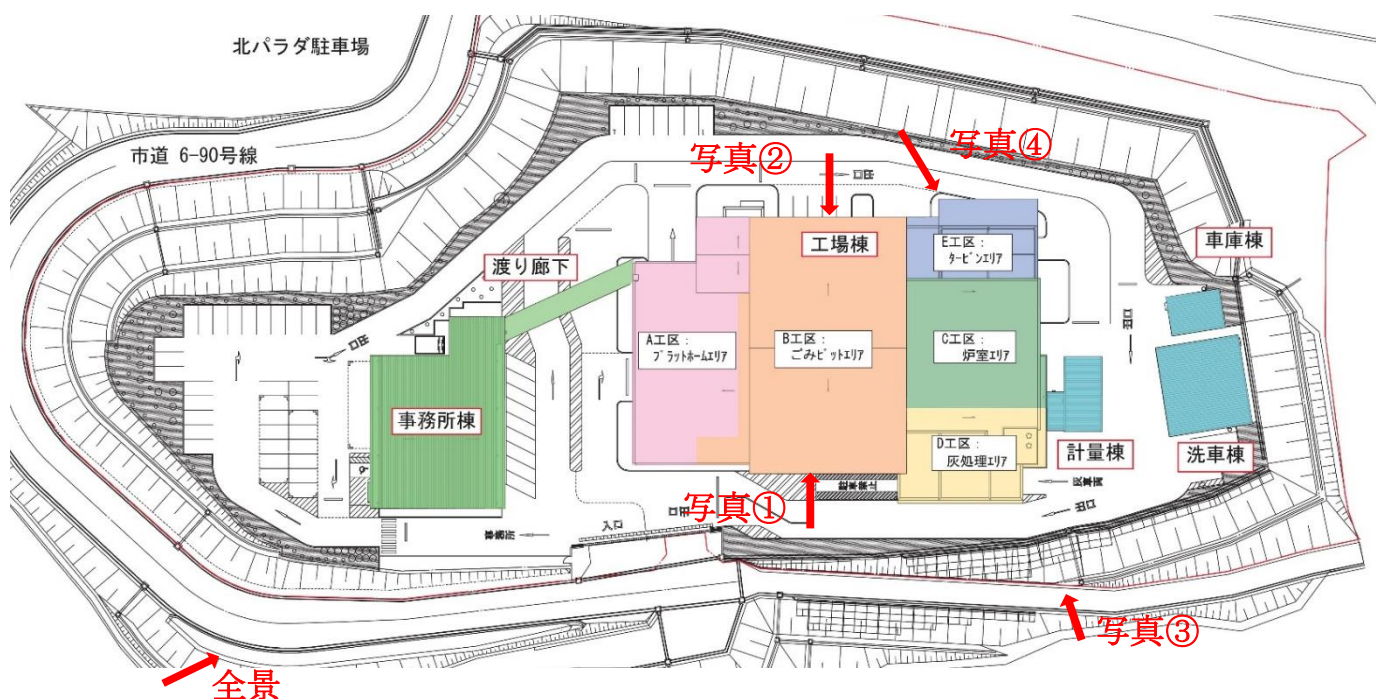

【ドローン撮影：平成 30 年 9 月 26 日】

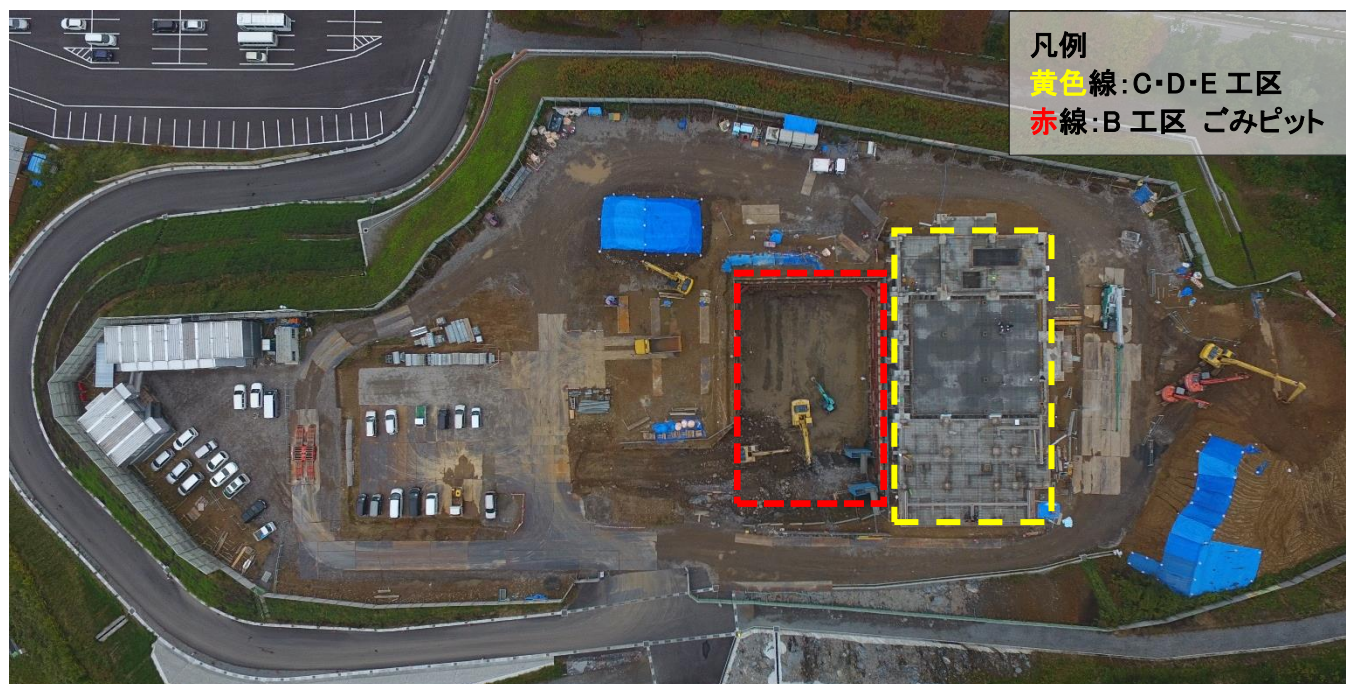

◆全景写真：平成 30 年 9 月 22 日



◆ごみピットエリア【B工区】

造成工事の際の硬い岩盤とつながっている箇所のため、破砕作業に時間を要しましたが、工程に大きな影響はありませんでした。

【写真①】



【写真②】



◆炉室・灰処理・タービン エリア【C・D・E工区】

各工区の地中梁及びC工区のマットスラブのコンクリート工事では、随時立会い検査を行い、安全面をはじめ、工程管理、品質管理を徹底しました。

【写真③】 マットスラブ打込み



【写真④】 E工区



◆今後の予定【10月から11月】

- ・B工区は、ごみピット本体の床や壁部分の躯体工事（鉄筋・型枠・コンクリート工事等）となります。
- ・C・D・E工区は、1階の躯体工事を継続し、11月からは、プラント機械の設置が始まります。
