

新クリーンセンター建設状況について

平成 31 年 1 月 4 日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆12 月末現在の進捗状況【工事進捗率：13.9%】


【土木建築工事・プラント工事】工場棟

B 工区は、ごみピットの地下部分となるコンクリート打設作業を終え、ごみピット外側の仮設足場、山留親杭 80 本を撤去し、埋戻しを行いました。

C・D 工区は、継続して 1 階部分の機械の据付・調整、焼却炉やボイラ等を支えるためのプラント架構及び建物の柱、梁となる鉄骨の建て方工事を行いました。

引き続き、環境に配慮し安全、安心な工事の進捗に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

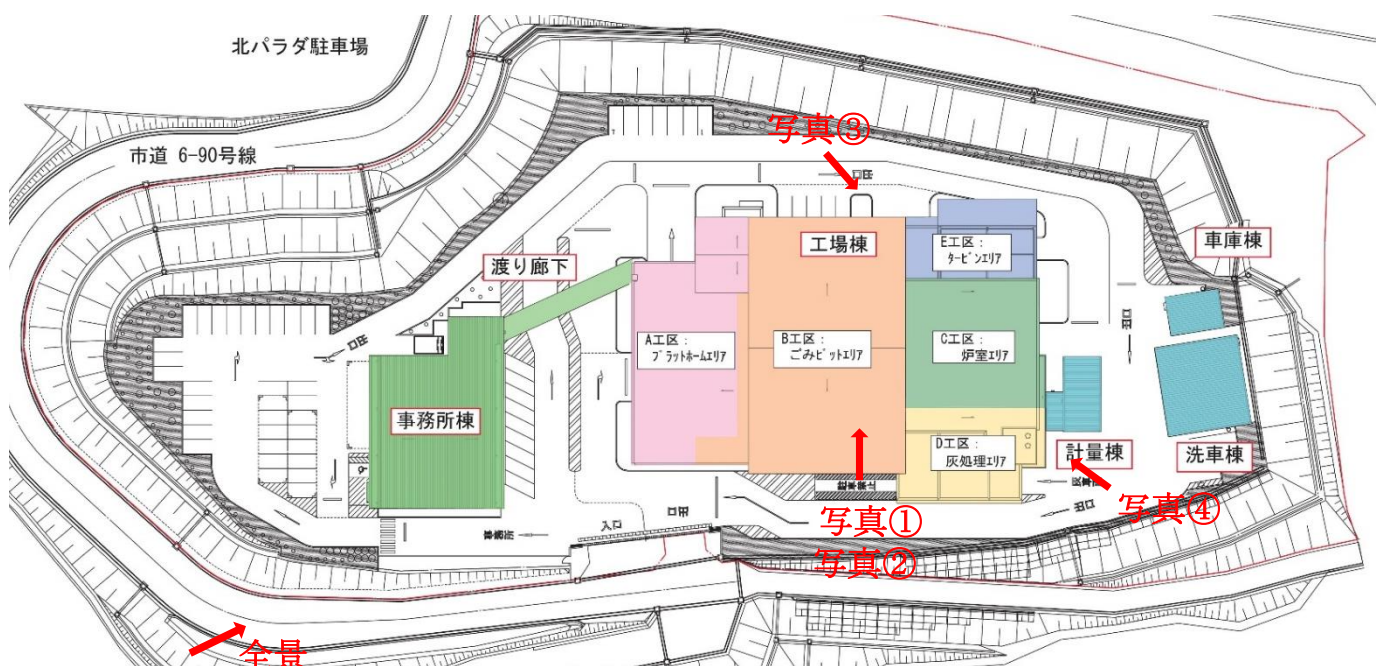

【ドローン撮影：平成 30 年 12 月 19 日】



◆全景写真：平成 30 年 12 月 26 日



◆ごみピットエリア【B工区】

施工が完了した地下部分の躯体（柱・壁）について検査を行い、不具合が無いことを確認し、残土の埋戻しを行いました。

【写真①：埋戻し前】



【写真②：埋戻し後】



◆炉室・灰処理エリア【C・D工区】

プラント架構、鉄骨の建て方工事では、高所での作業が続きます。特に、霜等により鉄骨等が滑りやすくなるので、墜落防止対策や安全点検をさらに強化しています。

【写真③】



【写真④】



◆今後の予定【1、2月】

- ・プラント機械、鉄骨等の製作、検査を実施していきます。

以上
