

新クリーンセンター建設状況について

平成 31 年 4 月 1 日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆3 月末現在の進捗状況【工事進捗率：15.5%】

【土木建築工事・プラント工事】工場棟


A・B 工区は、強固な地盤とするため地盤改良工事（エルニード工法）を行っています。

D 工区は、躯体水槽・柱・壁の鉄筋・型枠・埋込金物工事やコンクリート打設工事を行いました。


プラントの大型機器を取り込むために、場内東側に 200 t クレーンを設置しました。

引き続き、環境に配慮し安全、安心な工事の進捗に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

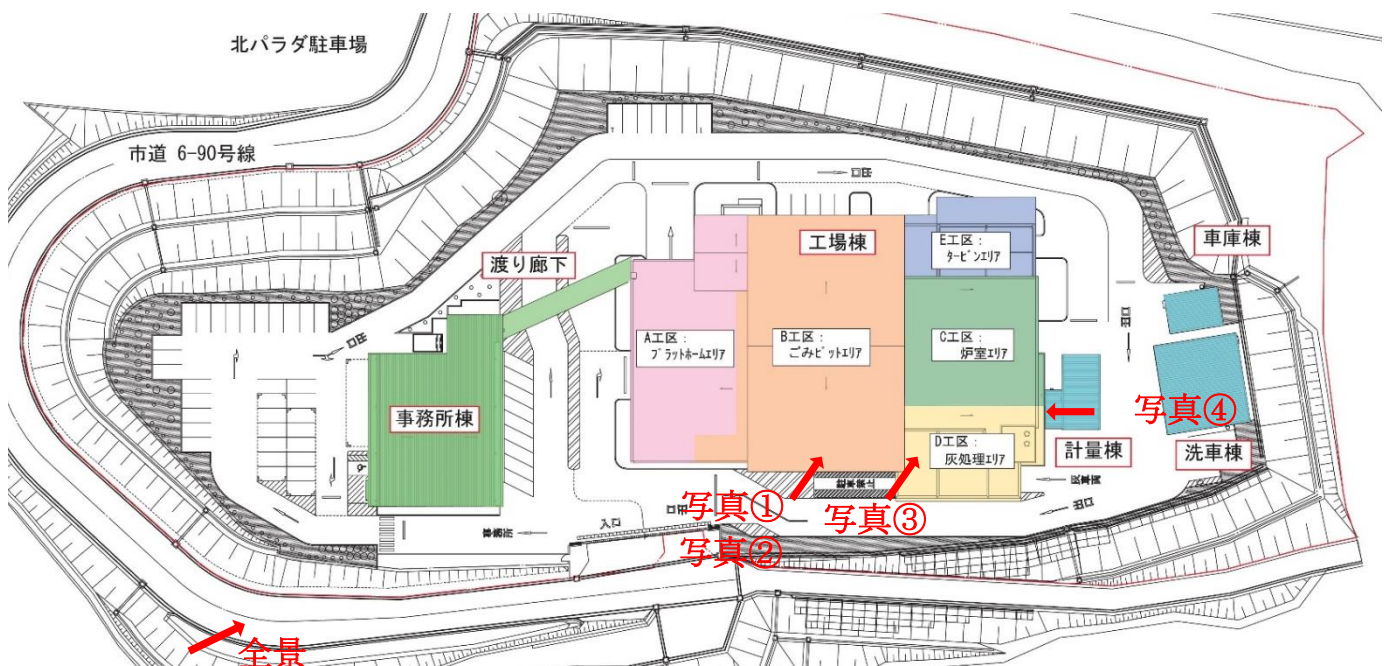

【ドローン撮影：平成 31 年 3 月 22 日】

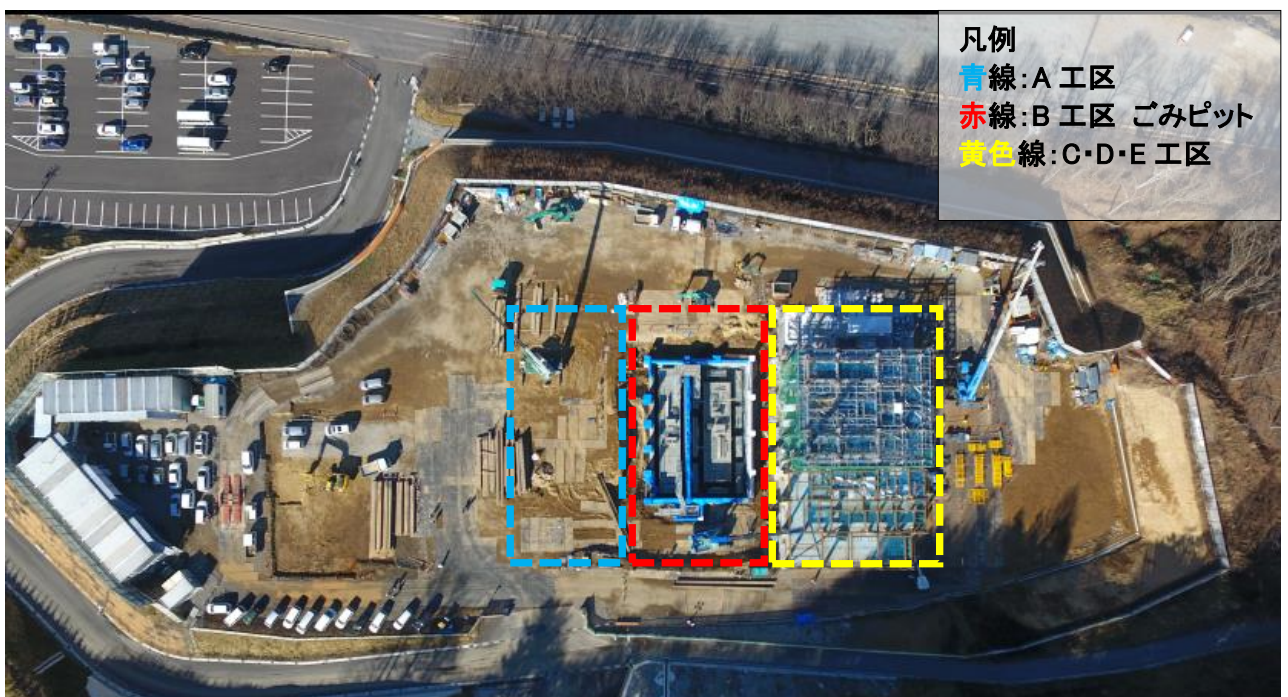

◆全景写真：平成 31 年 3 月 22 日



◆プラットホーム・ごみピットエリア【A・B工区】

地盤改良工事では、重機との接触、掘削開口への転落に注意して作業を進めています。

【写真①】



【写真②】



◆灰処理エリア【D工区】

躯体水槽の配筋・埋込金物状況の検査を行い、施工不具合の無いことを確認した後にコンクリート打設を実施しています。

【写真③】



【写真④】



◆今後の予定【4月】

- ・土木建築工事：A・B工区の地中基礎工事、D工区基礎工事を継続します。
- ・プラント工事：大型機器の据付工事、架構建て方工事の第2節が始まります。

以上
