

新クリーンセンター建設状況について

令和元年5月7日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆ 4月末現在の進捗状況【工事進捗率：24.9%】

【工場棟工事】


A・B工区は、掘削、基礎・地中梁の配筋・型枠組立て及びコンクリート打設を行いました。

C工区は、プラント架構の建て方を1階床から約20m部分まで行い、順次プラント機械の設置工事を進めています。

D工区は、2階床及び機械基礎のコンクリート打設を行い、プラント機械の一部を設置しました。


来年12月の本格稼働を目指し、引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

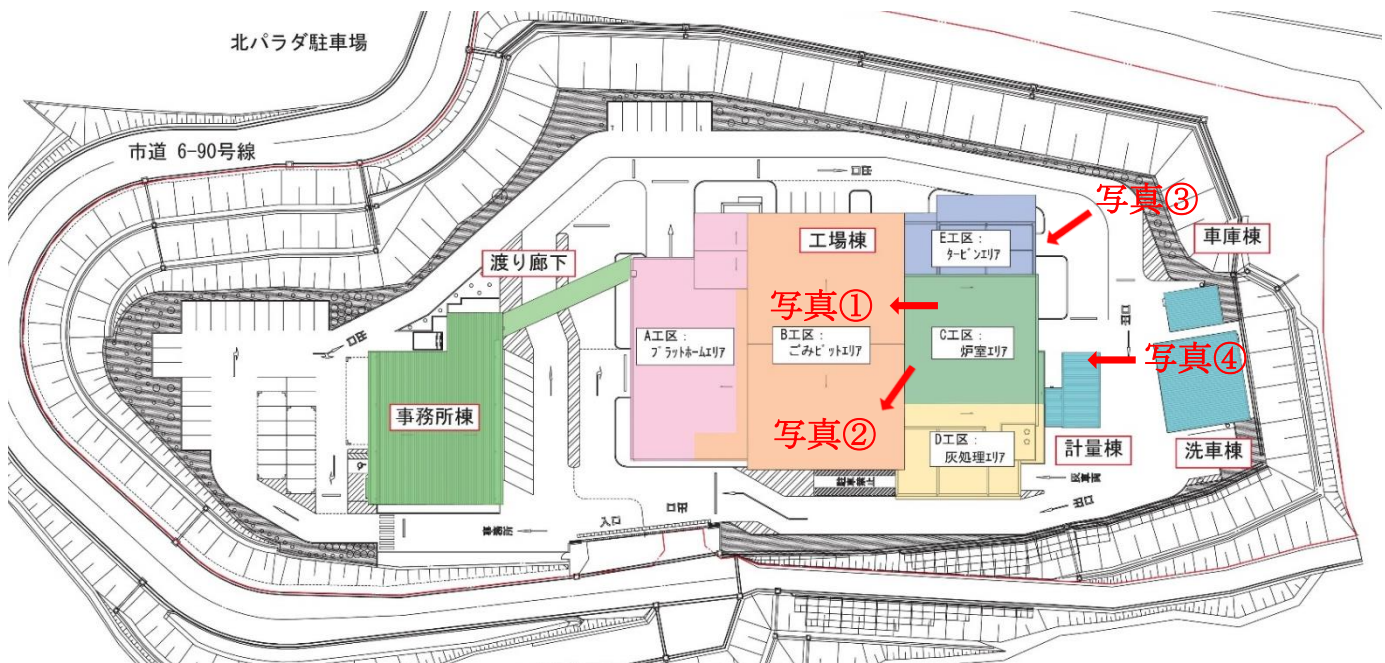

全景 ➡

【ドローン撮影：平成31年4月16日】

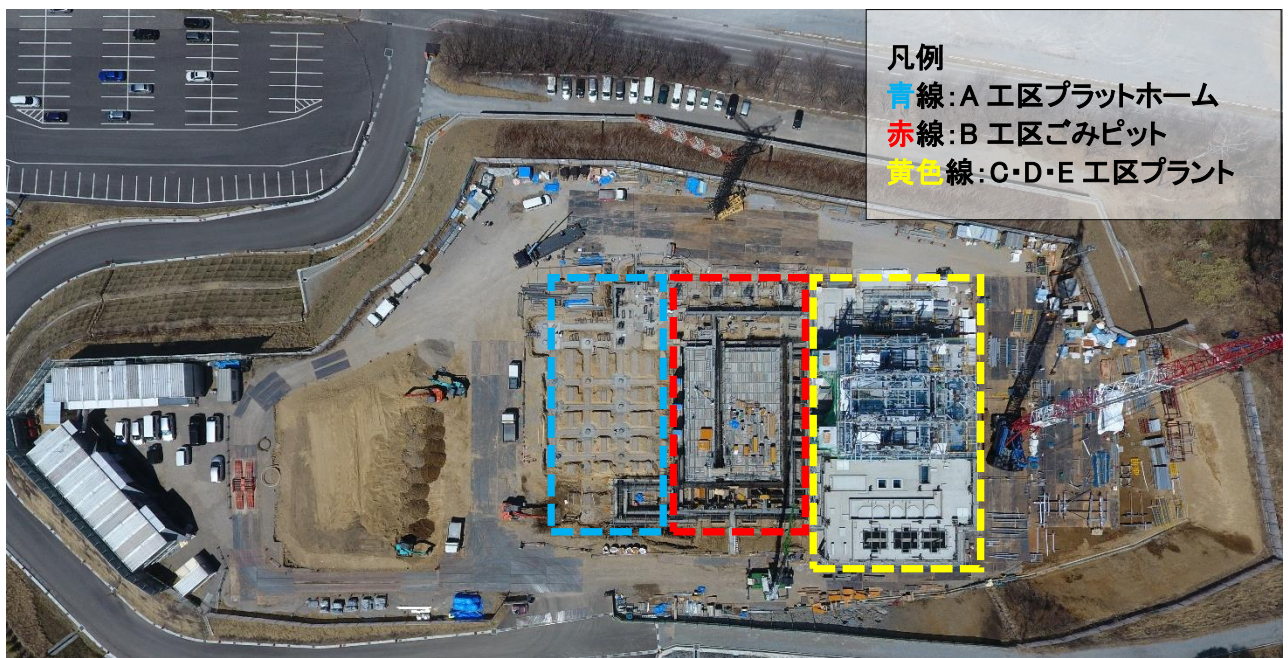

◆全景写真：平成 31 年 4 月 27 日



◆プラットホーム・ごみピットエリア【A・B工区】

ごみピット地下部分の工事を終え、残りの基礎、地中梁工事を進めています。

【写真①】



【写真②】



◆炉室エリア【C工区】

プラント機械を設置する「架構」の建て方が進み、焼却炉や減温塔等の主要なプラント機械の設置が始まりました。

【写真③】 焼却炉の一部



【写真④】 減温塔



◆今後の予定【5月】

- ・ 建築工事：引き続き A・B 工区は、基礎・地中梁工事を、D・E 工区は、地上部分の躯体工事を進めていきます。
- ・ プラント工事：引き続き各機械の据付調整、架構の工事を行います。

以上
