

新クリーンセンター建設状況について

令和元年 6 月 3 日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆ 5 月末現在の進捗状況【工事進捗率：29.2%】

【工場棟工事】


A・B 工区は、基礎・地中梁、1 階床の配筋・型枠組立及びコンクリート打設を行いました。
C 工区は、プラント架構の建て方が終わり、プラント機械、ダクトの設置工事を進めています。

D 工区は、2 階へ灰バンカ等のプラント機械を設置し、鉄骨の建て方が 3 階床まで終わり、コンクリート床工事を進めています。


E 工区は、鉄骨工事が始まりました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

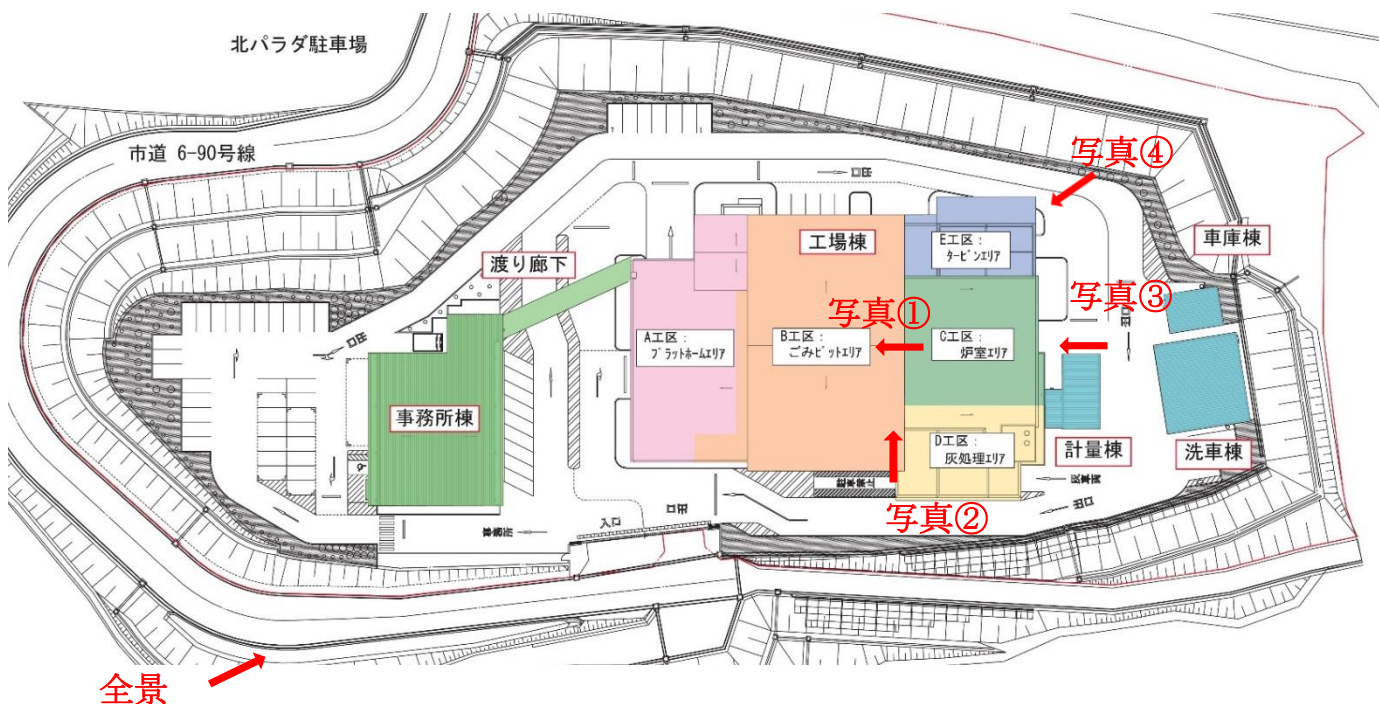

【ドローン撮影：令和元年 5 月 22 日】

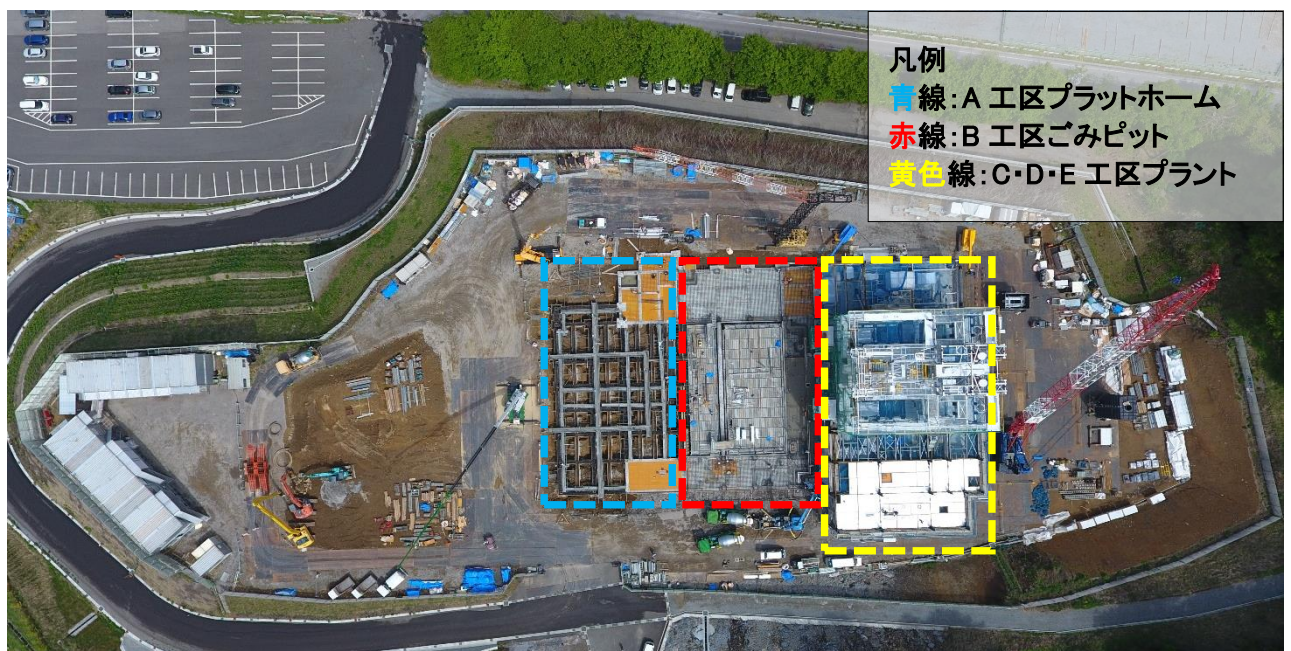


◆全景写真：令和元年 5 月 29 日



◆プラットホーム・ごみピットエリア【A・B工区】

A工区の基礎、地中梁工事、B工区の1階床の工事が完了しました。

【写真①】A工区

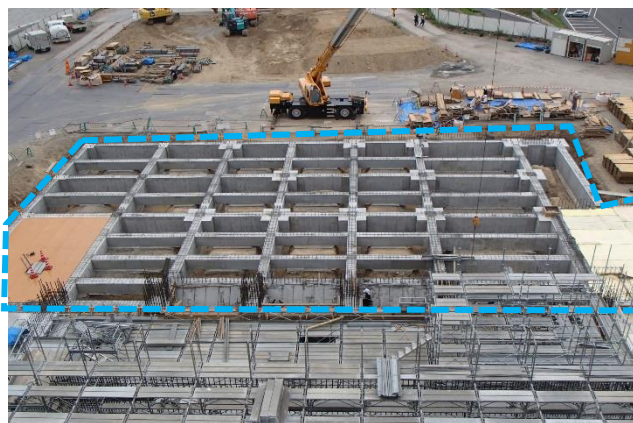


【写真②】B工区



◆炉室・タービンエリア【C・E工区】

C工区では大型の機械等の組立・据付工事を行い、E工区では1階床から約6.7m部分まで鉄骨の建て方が完了しました。

【写真③】C工区

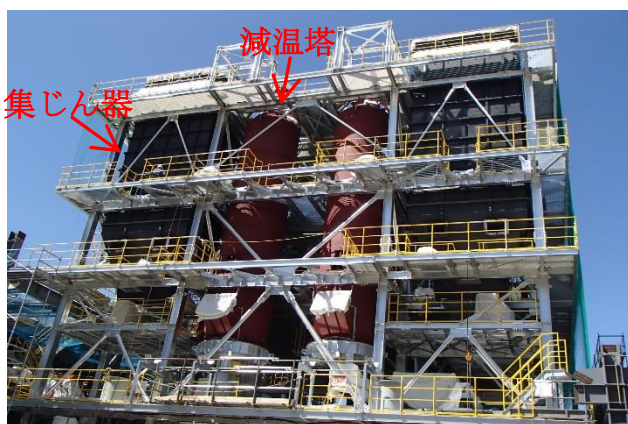

【写真④】E工区



◆今後の予定【6月】

- ・ 建築工事：工場棟A工区は1階床、B工区は1階壁・2階床の躯体工事を行い、D・E工区は鉄骨工事及びコンクリート床工事を進め、事務所棟は基礎工事を開始します。
- ・ プラント工事：引き続き、各機械の据付調整工事を行います。

以上
