

# 新クリーンセンター建設状況について

令和元年 7 月 1 日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

## ◆ 6 月末現在の進捗状況【工事進捗率：35.5%】

### 【工場棟工事】

A 工区は、1 階の床配筋及びコンクリート打設を行いました。

B 工区は、2 階床までの柱・壁等の配筋・型枠の組立を進めています。

C 工区は、ボイラの組立工事を開始し、ダクトの組立工事を継続して行っています。

D 工区は、3 階床のコンクリート打設及びプラント機械の設置工事を行っています。


E 工区は、3 階床まで鉄骨の建て方が終わり、床工事を進めています。

### 【事務所棟工事】


掘削を行い基礎工事を開始しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

### 【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

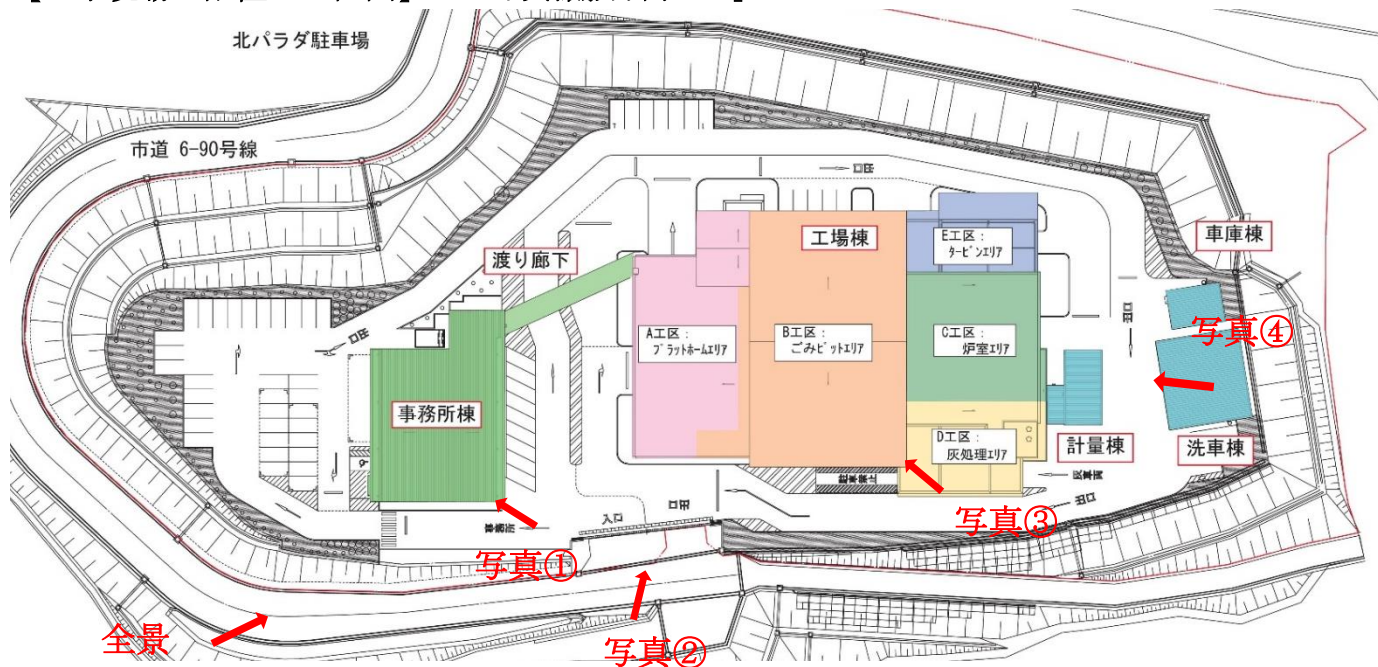

【ドローン撮影：令和元年 6 月 24 日】

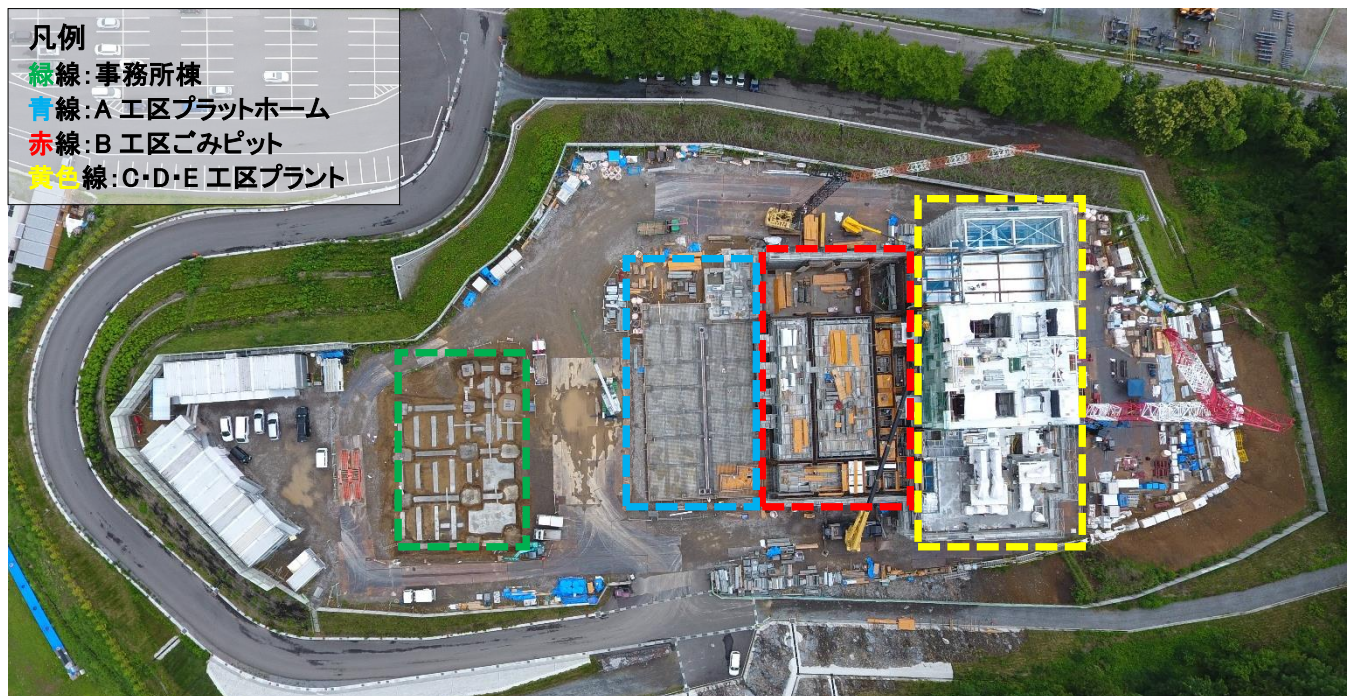

◆全景写真：令和元年6月25日



◆事務所棟・プラットホームエリア【事務所棟・A工区】

事務所棟は掘削工事を終え基礎等の配筋工事に入ります。A工区では1階床のコンクリート工事を終え、敷地の都合により当面は資材置場とし、他工区の工事を進めます。

【写真①】事務所棟



【写真②】A工区




◆ごみピット・炉室エリア【B・C工区】

B工区の1階壁の配筋・型枠工事が順調に進んでいます。C工区ではボイラ等の大型機械の組立・据付けをしています。

【写真③】B工区



【写真④】C工区

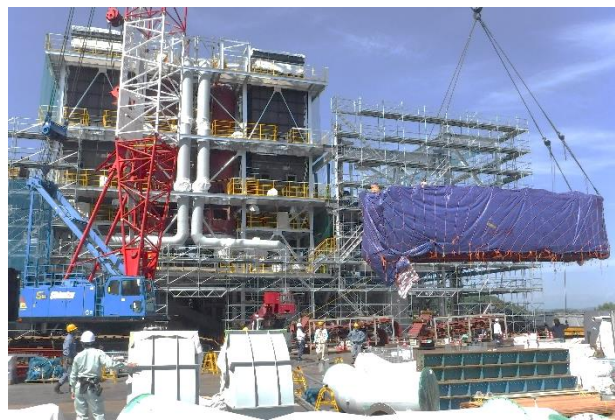

◆今後の予定【7月】

- ・ 建築工事：工場棟B工区は1階壁・2階床のコンクリート工を行い、次の階層へ進め、D・E工区は引き続き鉄骨工事・コンクリート床工事を進め、事務所棟は基礎工事を継続します。
- ・ プラント工事：引き続き、各機械の据付調整工事を進めます。

以上
