

新クリーンセンター建設状況について

令和元年8月5日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆7月末現在の進捗状況【工事進捗率：44.0%】

【工場棟工事】

- A工区は、1階床コンクリート工事まで終わり、しばらくの間、資材置き場としています。
- B工区は、2階床までのコンクリート打設が終わり、2階柱・壁の鉄筋・型枠工事を進めています。
- C工区は、ボイラ及びダクトの組立工事を継続して行っています。
- D工区は、4階までの建て方が終わり、屋根の鉄骨工事に移ります。
- E工区は、3階床のコンクリート打設が終わり、プラント機械の設置工事を行っています。


【事務所棟工事】

基礎・地中梁のコンクリート打設が終わり、埋戻しを行っています。
引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」



【ドローン撮影：令和元年7月19日】

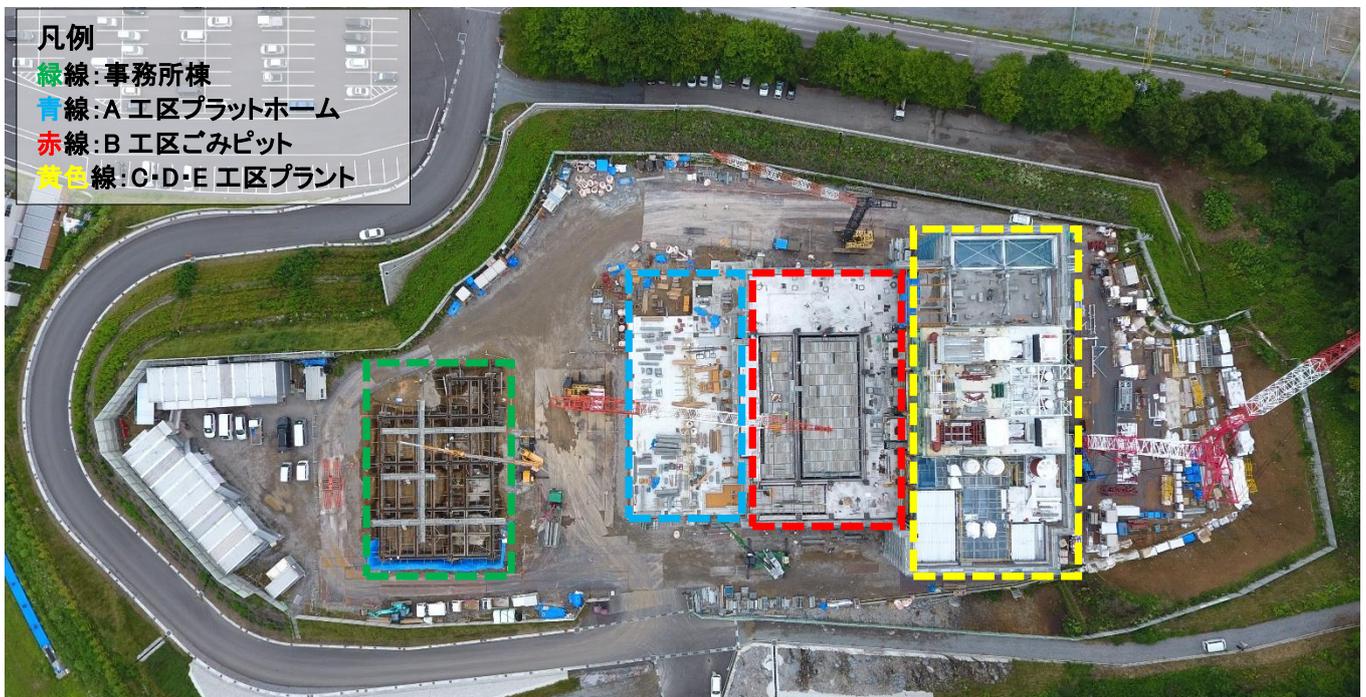

◆全景写真：令和元年7月30日



◆事務所棟・ごみピットエリア【事務所棟・B工区】

事務所棟は敷地外へ仮置きした掘削土を搬入し埋戻しを行っています。B工区は2階床（階高約6m）までのコンクリート打設が終わりました。

【写真①】事務所棟

【写真②】B工区



◆炉室エリア【C工区】

C工区では、焼却炉内の耐火工事が始まりました。

【写真③】C工区

【写真④】耐火工事



◆今後の予定【8月】

- ・ 建築工事：工場棟B工区は2階柱・壁、3階床の鉄筋・型枠工事を、D・E工区は引き続き鉄骨工事を進め、事務所棟は1階床工事を行います。
- ・ プラント工事：引き続き、各機械の据付調整工事、焼却炉内の耐火工事を進めます。

以上
