

新クリーンセンター建設状況について

令和元年9月2日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆ 8月末現在の進捗状況【工事進捗率：50.6%】

【工場棟工事】

B工区は、2階柱・壁、3階床の配筋・型枠工事を進めています。

C工区は、ボイラ及びダクトの組立工事、焼却炉内の耐火工事を継続して行っています。

D工区は、4階及び屋根鉄骨の建て方、機器の据付けダクトの組立工事を行いました。


E工区は、プラント機械の設置工事を行い、3階床の防水工事を開始しました。

【事務所棟工事】

埋戻しが終わり、1階床の配筋、コンクリート打設を行いました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

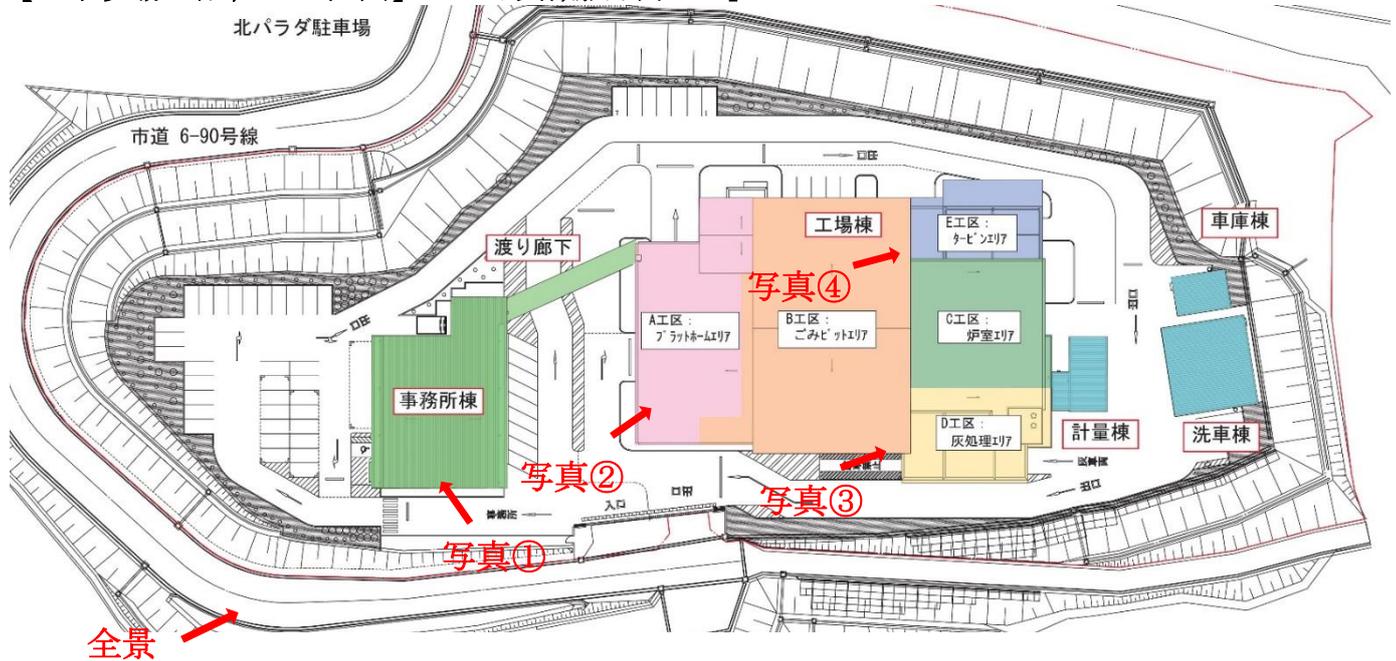

【ドローン撮影：令和元年8月21日】



◆全景写真：令和元年 8 月 29 日



◆事務所棟・ごみピットエリア【B工区】

事務所棟の1階床のコンクリート打設が終わりました。B工区は9月のコンクリート打設に向け、2階柱・壁、3階床の配筋・型枠工事を進めています。

【写真①】事務所棟



【写真②】B工区



◆灰処理・タービンエリア【D・E工区】

D工区は屋根の鉄骨工事をを行いました。E工区は大型機器（復水器）の組立工事を行っています。

【写真③】D工区（屋根鉄骨）



【写真④】E工区（復水器）



◆今後の予定【9月】

- ・建築工事：工場棟B工区は2階柱・壁、3階床のコンクリート打設を行い、次階層へ進みます。D・E工区は仕切り壁工事を開始します。事務所棟は鉄骨工事をを行います。
- ・プラント工事：引き続き、各機械の据付調整工事、焼却炉内の耐火工事を進めます。

以上
