

新クリーンセンター建設状況について

令和元年10月1日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆ 9月末現在の進捗状況【工事進捗率：54.2%】

【工場棟工事】

B工区は、3階柱・壁、4階床の配筋・型枠工事を進めています。

C工区は、焼却炉内の耐火工事、ボイラの水圧試験が終了し、ボイラの保温工事を開始しました。また、プラント機械・ダクトの組立工事を継続して行っています。

D工区は、煙突の鉄骨工事、内部間仕切工事を開始しました。


E工区は、3階床の防水工事が終了し、プラント機械の据付工事を再開しました。

【事務所棟工事】


鉄骨工事を開始しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

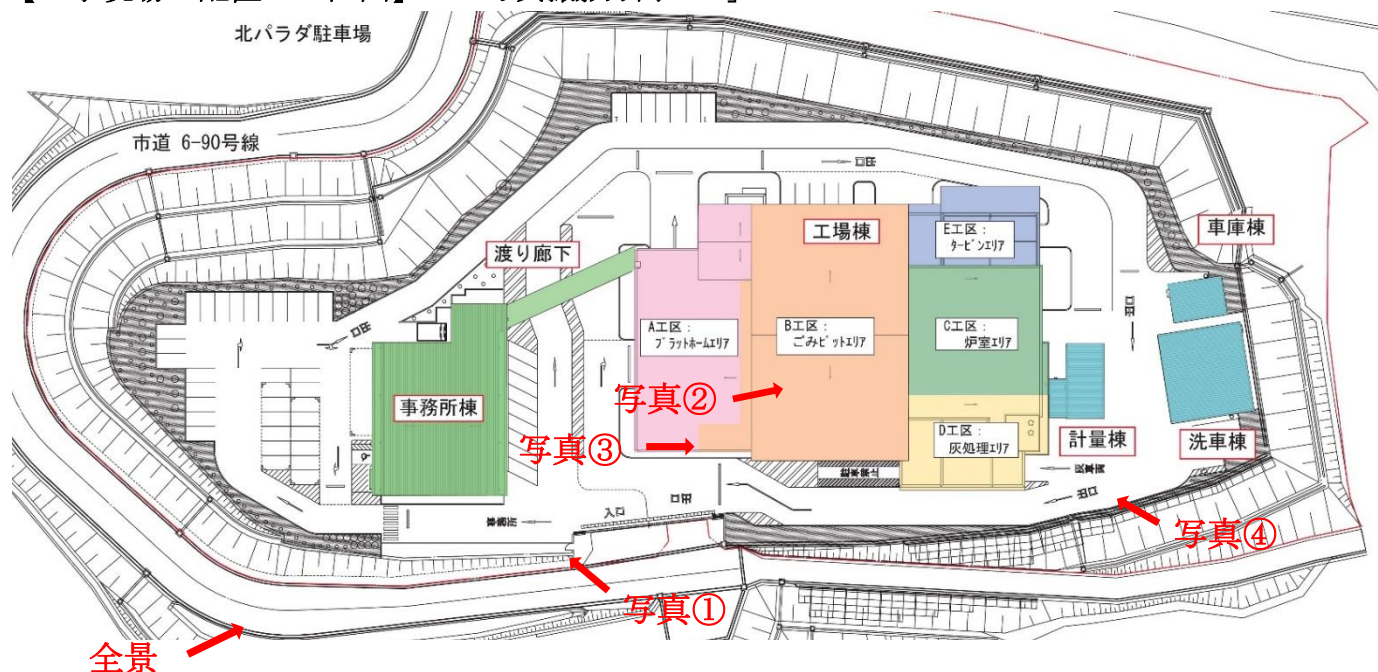

【ドローン撮影：令和元年9月19日】

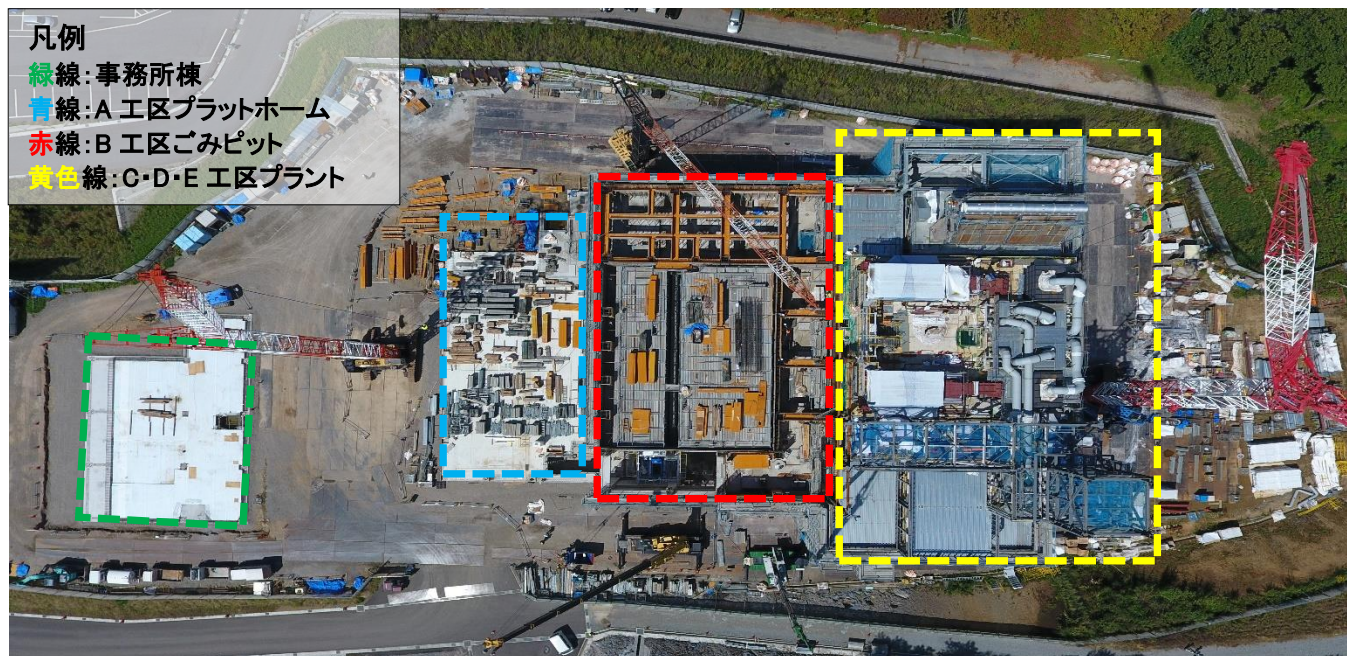

◆全景写真：令和元年9月27日



◆事務所棟・プラントエリア【C・D・E工区】

事務所棟は鉄骨の建て方工事を開始しました。プラントエリアは大型機械の設置が終わり、残りのプラント機械やダクトの組立工事を継続して進めています。

【写真①】事務所棟



【写真②】プラントエリア



◆ごみピットエリア【B工区】・灰処理エリア【D工区】

B工区の一部に粗大ごみ破碎設備を設置しました。D工区では煙突下部の鉄骨建て方工事をを行いました。

【写真③】B工区（粗大ごみ破碎設備）



【写真④】D工区（煙突下部）



◆今後の予定【10月】

- ・建築工事：B工区は3階柱・壁、4階床のコンクリート打設を行い、次階層へ進みます。D工区は煙突鉄骨工事を継続して行います。事務所棟は屋根・2階床工事を行います。
- ・プラント工事：引き続き、各機械の据付調整工事を進め、ボイラ内の耐火工事を開始します。

以上
