

新クリーンセンター建設状況について

令和元年11月1日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆10月末現在の進捗状況【工事進捗率：62.9%】

【工場棟工事】

B工区は、4階床までのコンクリート打設が終了し、4階柱・壁の工事を進めています。

C工区は、プラント機械・ダクトの組立工事、ボイラの耐火工事、保温工事を継続して行い、電気計装工事を開始しました。

D工区は、煙突の鉄骨工事が終了し、内筒工事が始まりました。また、外壁工事を継続して行っています。


E工区は、プラント機械の組立工事を継続して行い、配管工事、外壁工事を開始しました。

【事務所棟工事】

鉄骨工事、2階床・屋上階床のコンクリート工事を行いました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

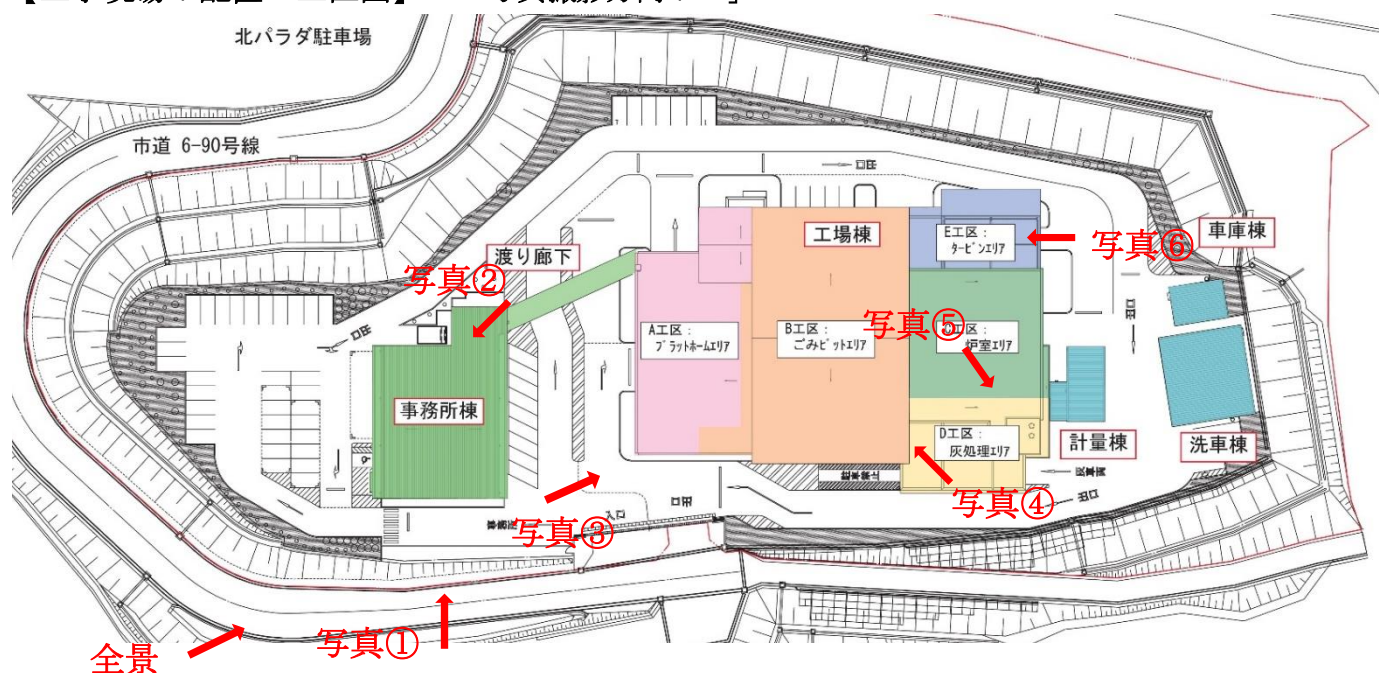

【ドローン撮影写真については、都合によりお休みとなりました m(_ _)m】

◆全景写真：令和元年10月31日



◆事務所棟

事務所棟では2階までの鉄骨建て方工事、2階床・屋上階床のコンクリート工事を終了しました。

【写真①】事務所棟



【写真②】事務所棟2階



◆ごみピットエリア【B工区】

B工区では11月中旬のコンクリート打設に向け4階柱・壁の鉄筋・型枠工事を進めています。

【写真③】ごみピットエリア



【写真④】ごみピット4階



◆灰処理エリア【D工区】・タービンエリア【E工区】

D工区では煙突の内筒工事を行っています。E工区では蒸気排気管の組立を行っています。

【写真⑤】D工区（煙突下部鉄骨+煙突内筒）



【写真⑥】E工区（蒸気排気管）



◆今後の予定【11月】

- ・ 建築工事：B工区は4階柱・壁・梁の鉄筋・型枠工事を行い、コンクリート打設を行います。
C・D・E工区は外壁工事、屋根工事を行います。
事務所棟は屋根の鉄骨工事、外壁工事を行います。
- ・ プラント工事：引き続き、各種工事（機器据付・耐火・配管・保温等）を継続して行います。

以上
