

新クリーンセンター建設状況について

令和元年12月2日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆ 11月末現在の進捗状況【工事進捗率：71.1%】

【工場棟工事】

B工区は、最上階となる4階の躯体工事を進めるとともに、下層階ではプラント機械の据付け、ダクトの組立工事を行っています。また、1階の受変電室・2階の居室では、電気設備工事を開始しました。


C、D、E工区は、外壁工事が概ね終了し、屋根工事を開始しました。また、プラント機械・ダクトの組立工事、ボイラの耐火工事、保温工事、電気計装工事など継続して行っています。

【事務所棟工事】


屋根の鉄骨工事を終了し、外壁工事を開始しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

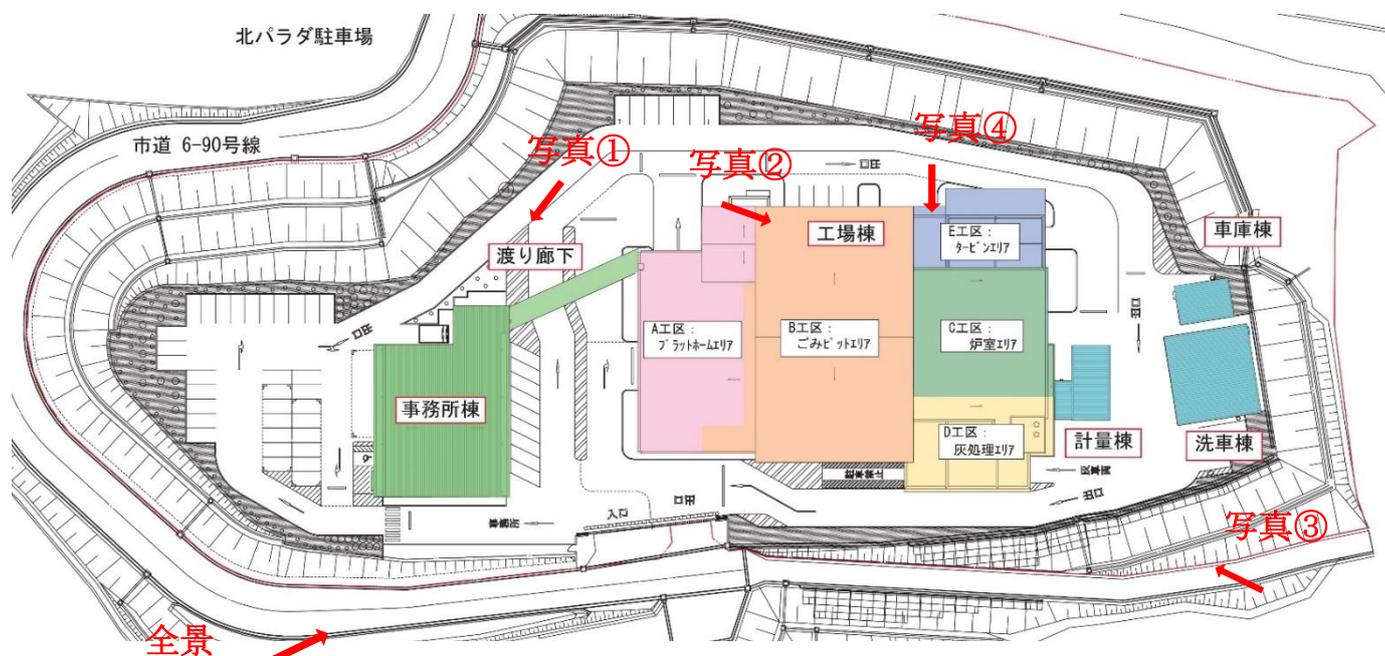

【ドローン撮影：令和元年11月20日】

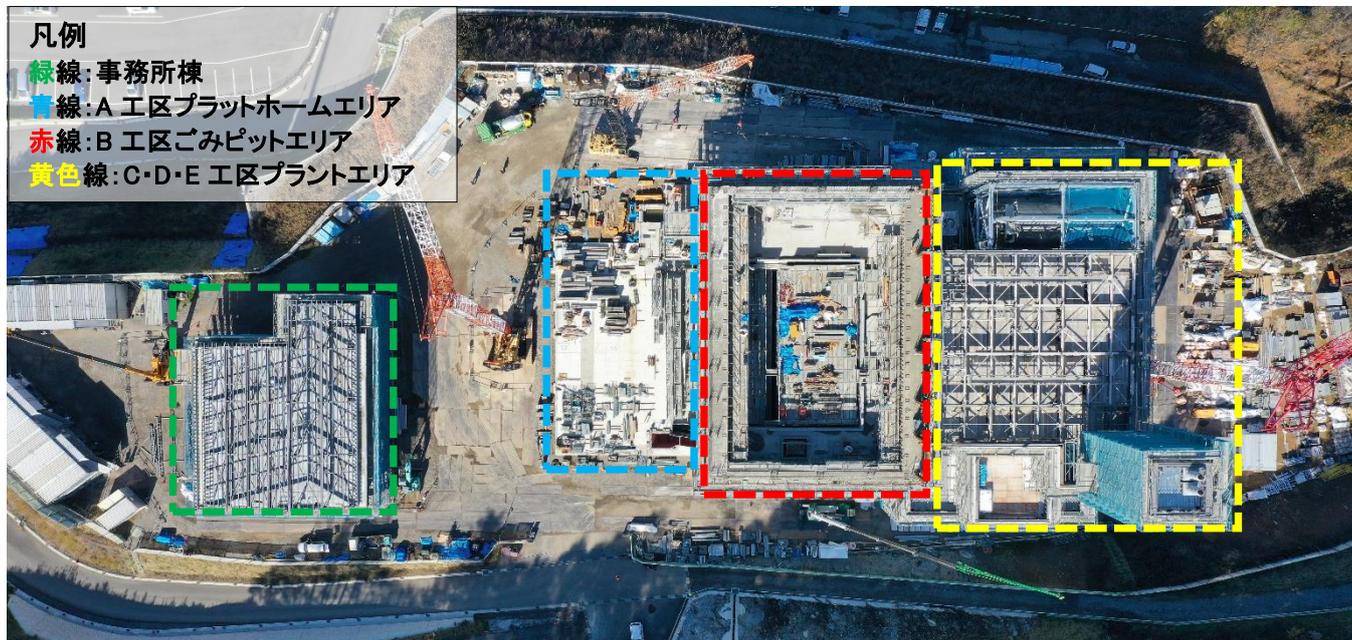

◆全景写真：令和元年 11 月 29 日




◆事務所棟・ごみピットエリア【B工区】

事務所棟は外壁工事を開始しました。B工区では1階で電気盤等の設置を開始しました。

【写真①】事務所棟（外壁工事）

【写真②】B工区（受変電室）

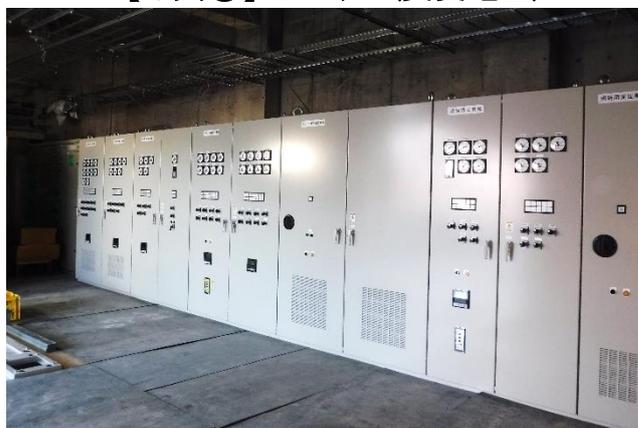


◆炉室エリア【C工区】・灰処理エリア【D工区】・タービンエリア【E工区】

CDE工区では外壁工事が概ね終了しました。また、プラント各種工事を継続しています。

【写真③】CDE工区（外壁工事）

【写真④】E工区（冷却塔の設置）

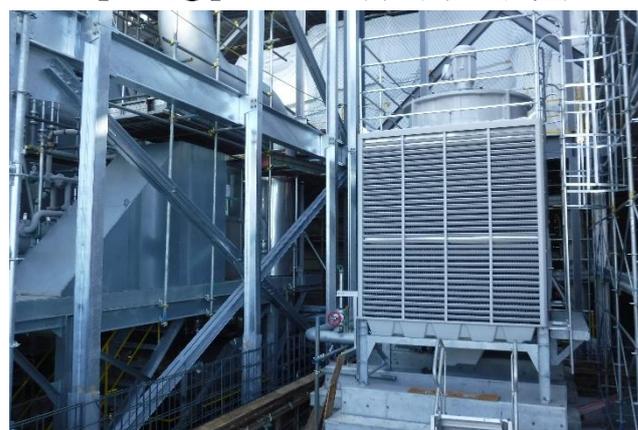

◆今後の予定【12月】

- ・建築工事：B工区は最上部までの壁・梁の鉄筋・型枠工事を行い、コンクリート打設を行います。また、各所一般機械設備工事、電気設備工事を継続して行います。CDE工区は屋根工事を行います。事務所棟は外壁工事を継続し、内部の工事に取りかかります。
- ・プラント工事：引き続き、各種工事（機器据付・耐火・配管・保温・電気計装等）を継続して行います。

以上
