

新クリーンセンター建設状況について

令和2年1月6日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆12月末現在の進捗状況【工事進捗率：79.2%】

【工場棟工事】

B工区は、最上階までのコンクリート打設を終了し、各階の居室の建具・内装工事、給排水や空調、電気などの設備工事を行っています。


C、D、E工区では、プラント機械・ダクトの組立工事、保温工事、配管工事、電気計装工事など継続して行っています。また、D、E工区で外壁の塗装工事を開始しました。

【事務所棟工事】


外壁工事、屋根工事が概ね終了し、建具・内装工事、設備工事を開始しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

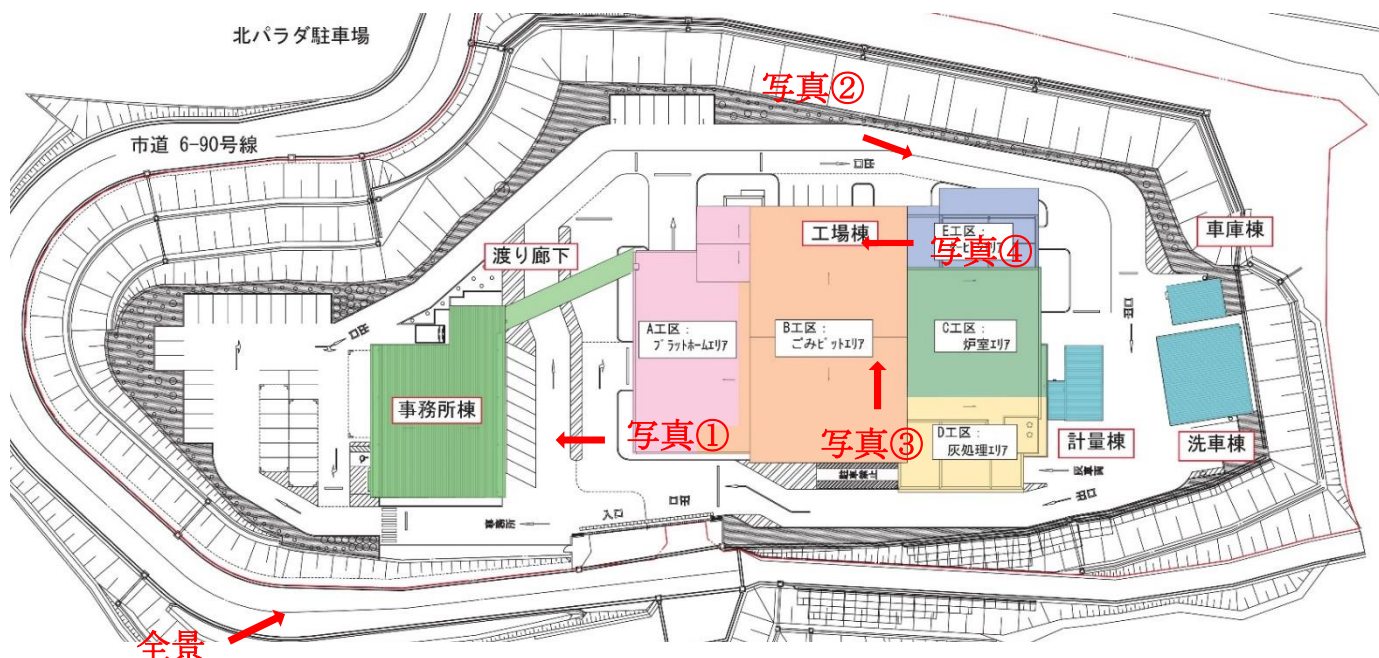

【ドローン撮影：令和元年12月25日】

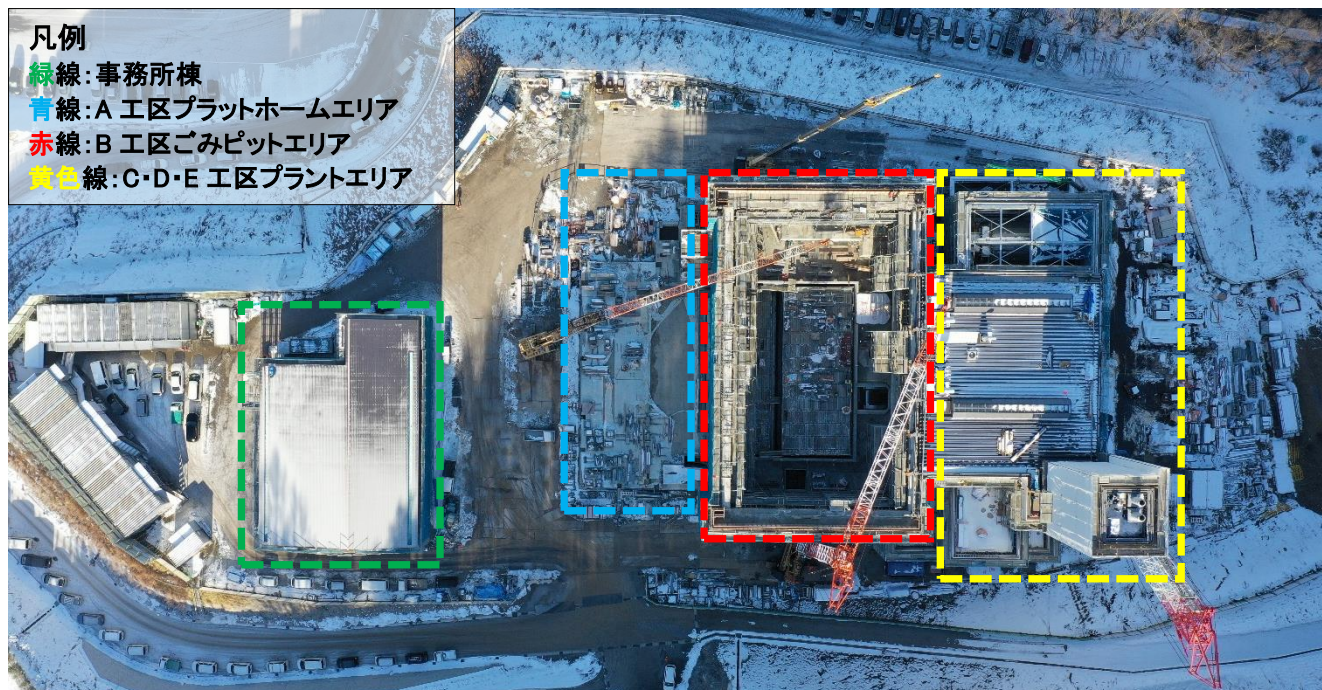

◆全景写真：令和元年 12 月 27 日



◆事務所棟・タービンエリア【E 工区】

事務所棟は外壁工事、屋根工事が概ね終了しました。E 工区では外壁の塗装工事を開始しました。

【写真①】事務所棟



【写真②】E 工区



◆ごみピットエリア【B 工区】

B 工区ではごみを炉に投入する「ごみホッパ」の設置が終わり、居室の内装工事を進めています。

【写真③】B 工区（ごみホッパ）



【写真④】B 工区（居室廊下）



◆今後の予定【1 月】

- ・ 建築工事：工場棟・事務所棟ともに、内装工事、一般機械設備工事、電気設備工事を継続して行います。
- ・ プラント工事：引き続き、各種工事（機器据付・耐火・配管・保温・電気計装 等）を継続して行います。また、B 工区では ごみクレーンの設置工事を行います。

以上
