

新クリーンセンター建設状況について

令和2年3月2日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆2月末現在の進捗状況【工事進捗率：82.6%】

【工場棟工事】

B工区は、屋根工事を開始し、屋根鉄骨の組立を行っています。また、各階の居室の建具・内装工事、給排水や空調、電気などの設備工事を継続して進めています。


C、D、E工区では継続して外壁の塗装工事、設備工事、プラント機械の組立工事、配管工事、電気計装工事、保温工事などを行っています。

【事務所棟工事】


建具工事、内装工事、設備工事などを継続して進めています

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

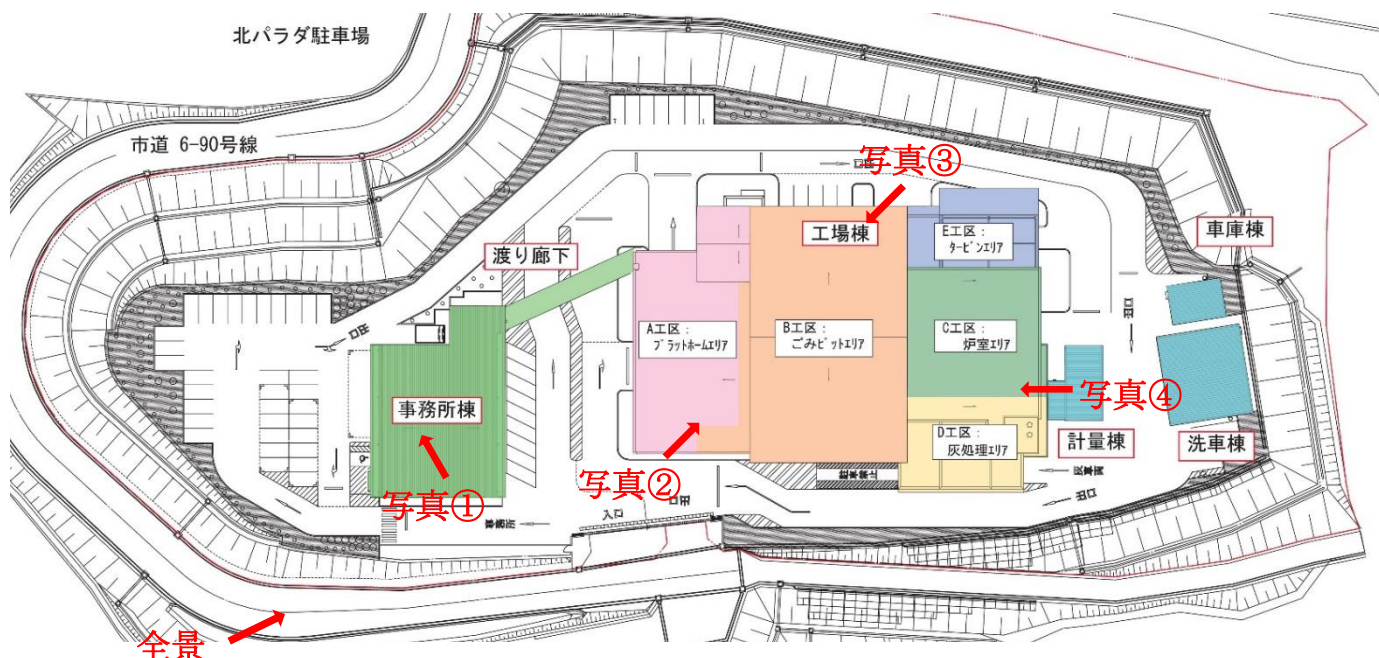

【ドローン撮影：令和2年2月27日】

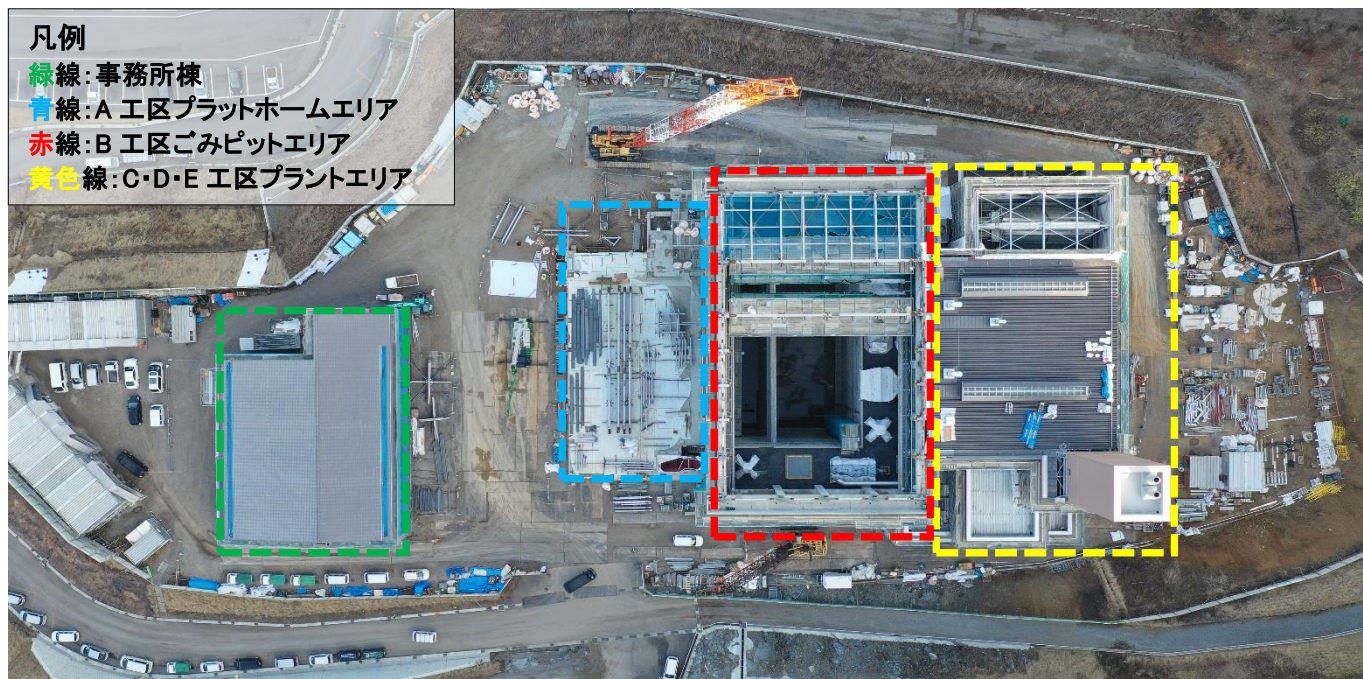


◆全景写真：令和2年2月28日



◆事務所棟・ごみピットエリア【B工区】

事務所棟は建具工事、内装工事、設備工事などを継続して行っています。B工区ではごみピットへの投入扉を設置しました。

【写真①】事務所棟：研修室（設備工事）

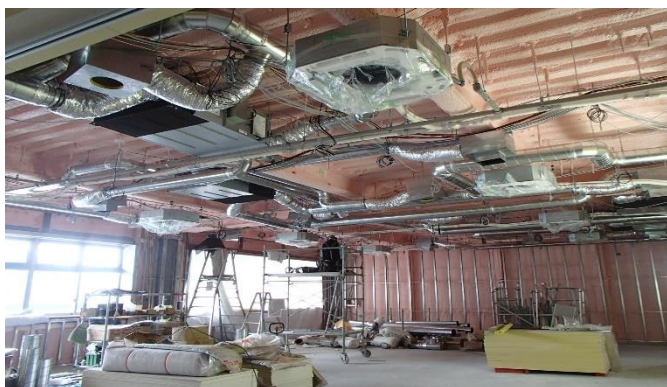

【写真②】B工区：投入扉設置



◆ごみピットエリア【B工区】・炉室エリア【C工区】

B工区では屋根鉄骨の組立を開始しました。C工区では配管工事、電気工事を継続して行っています。

【写真③】B工区：屋根鉄骨組立



【写真④】C工区：配管工事



◆今後の予定【3月】

- ・建築工事：工場棟・事務所棟ともに、内装工事、一般機械設備工事、電気設備工事を継続して行います。また、A工区の鉄骨工事を開始します。
- ・プラント工事：引き続き、各種工事（機器据付・配管・保温・電気計装 等）を行います。
