

新クリーンセンター建設状況について

令和2年5月1日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆4月末現在の進捗状況【工事進捗率：87.7%】

【工場棟工事】

A工区は、外壁工事が概ね終了し、塗装工事、内装工事を進めています。

B工区は、外壁の塗装工事、各階居室の内装工事、給排水や空調、電気などの設備工事、プラントの配管工事、電気工事を継続して行っています。

C、D、E工区では、設備工事、配管工事、電気計装工事、保温工事などを継続しています。


【事務所棟工事】

内装工事、設備工事などを継続して進めています。


【その他工事】 渡り廊下及び計量棟、洗車棟、車庫棟の付属棟の工事を開始しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

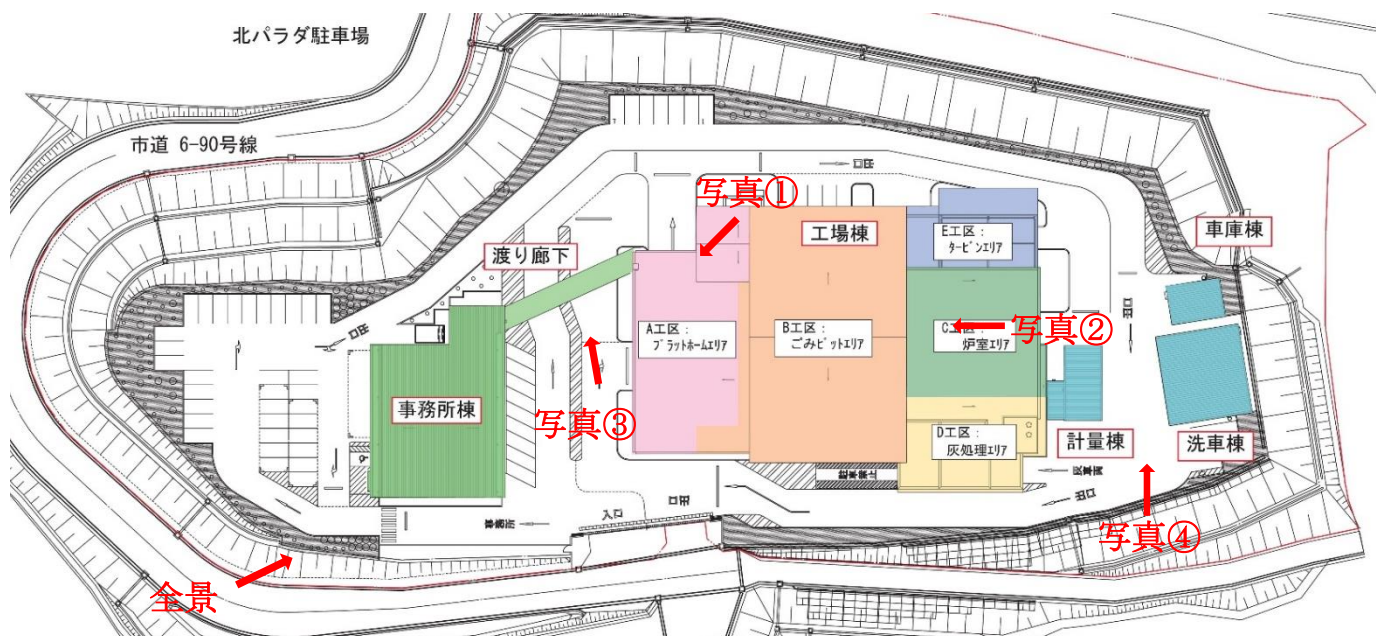

【ドローン撮影：令和2年4月23日】

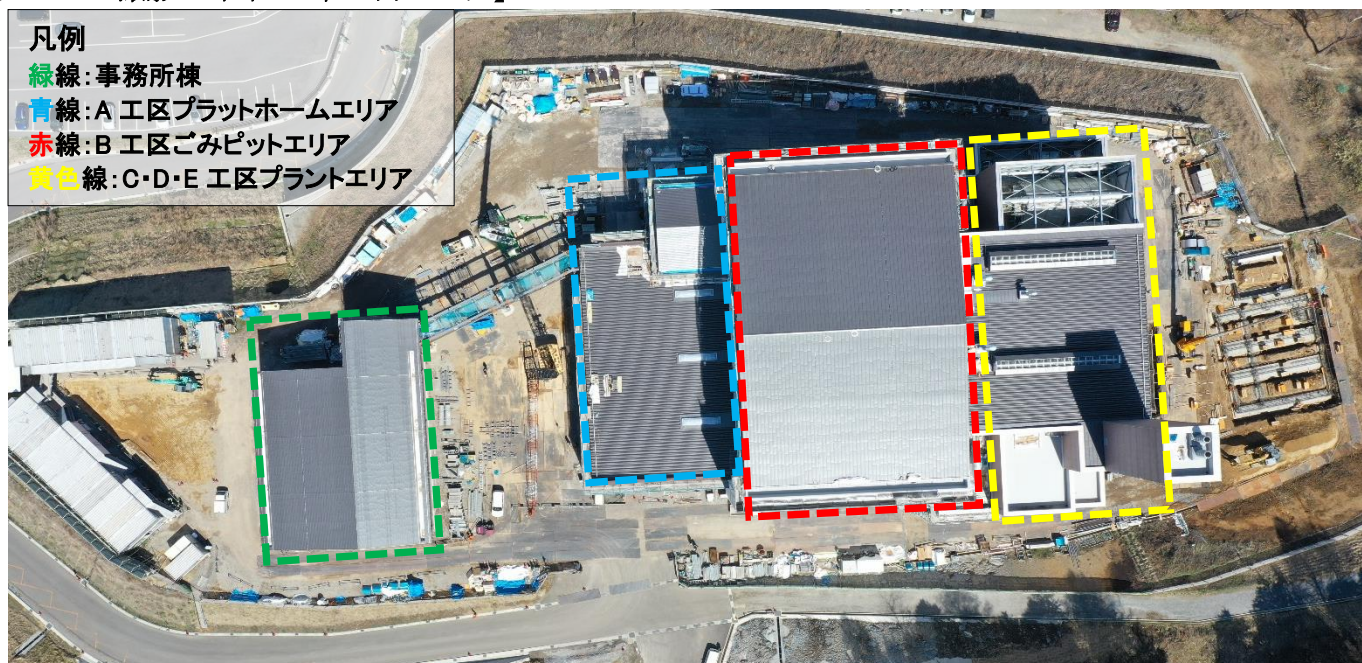

◆全景写真：令和2年4月28日



◆プラットホームエリア【A工区】・炉室エリア【C工区】

A工区ではALCパネルの施工が概ね終了しました。C工区では各プラント機械の配管・電気工事を継続して行っています。

【写真①】A工区：外壁工事




【写真②】C工区：配管・電気工事



◆渡り廊下・付属棟（計量棟、洗車棟、車庫棟）

渡り廊下は基礎工事が終了し、鉄骨建方、床・屋根の配筋工事を進めています。各付属棟は基礎工事を行っています。

【写真③】渡り廊下：鉄骨建方工事

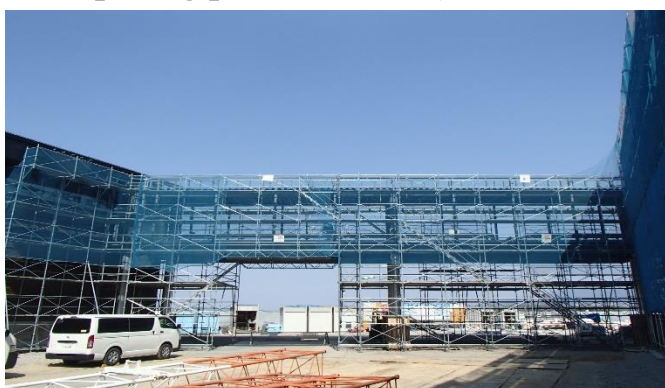

【写真④】付属棟：基礎工事



◆今後の予定【5月】

- ・建築工事：工場棟・事務所棟ともに、内装工事、一般機械設備工事、電気設備工事を継続して行います。付属棟では鉄骨工事を開始します。
- ・プラント工事：引き続き、各種工事（機器据付・配管・保温・電気計装 等）、6月の受電に向けた電気設備の調整確認を行います。
