

新クリーンセンター建設状況について

令和2年6月1日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆5月末現在の進捗状況【工事進捗率：91.9%】

【工場棟工事】

A、B工区は、外壁の塗装工事が終了し、各階居室の内装工事、給排水や空調、電気など設備工事、プラントの配管工事、電気工事を継続して行っています。

C、D、E工区では、設備工事、配管工事、電気計装工事、保温工事などを継続しています。


【事務所棟工事】 内装工事、設備工事などを継続して進めています。

【その他工事】


渡り廊下は、内外装工事を進めています。計量棟、洗車棟、車庫棟の付属棟では、基礎工事が終了し、鉄骨建て方工事を行いました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」

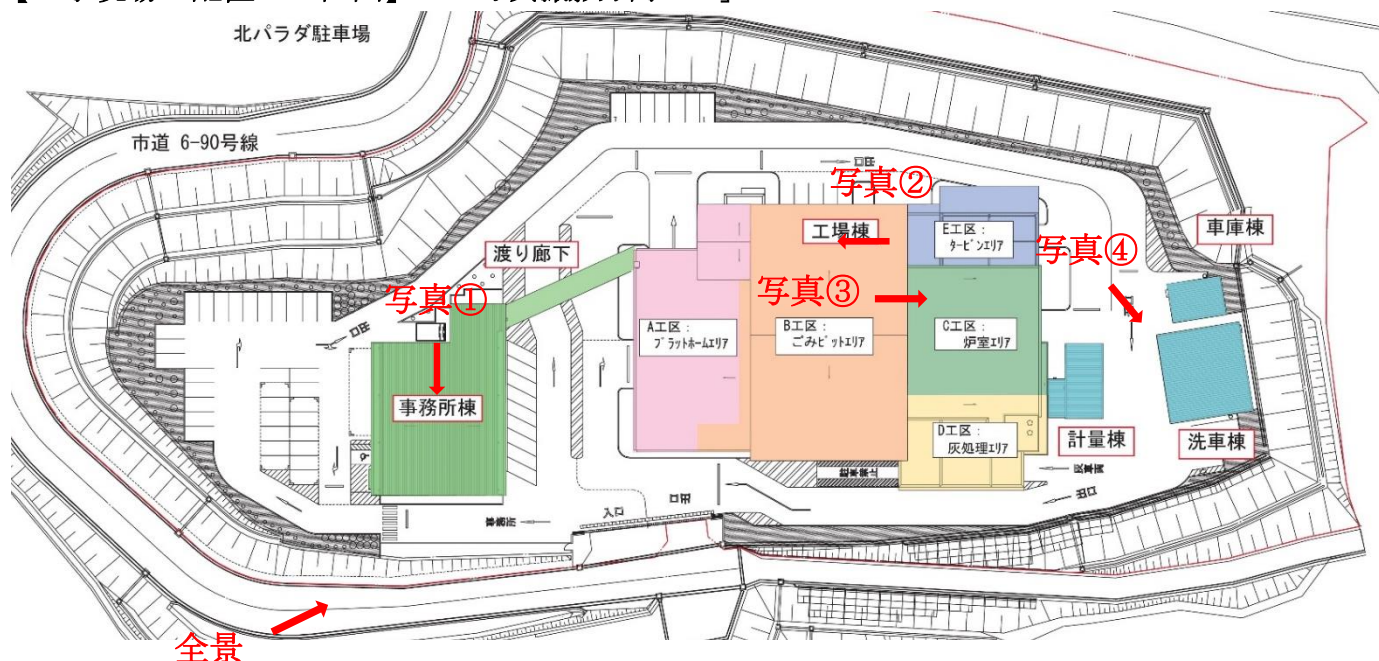

【ドローン撮影：令和2年5月28日】

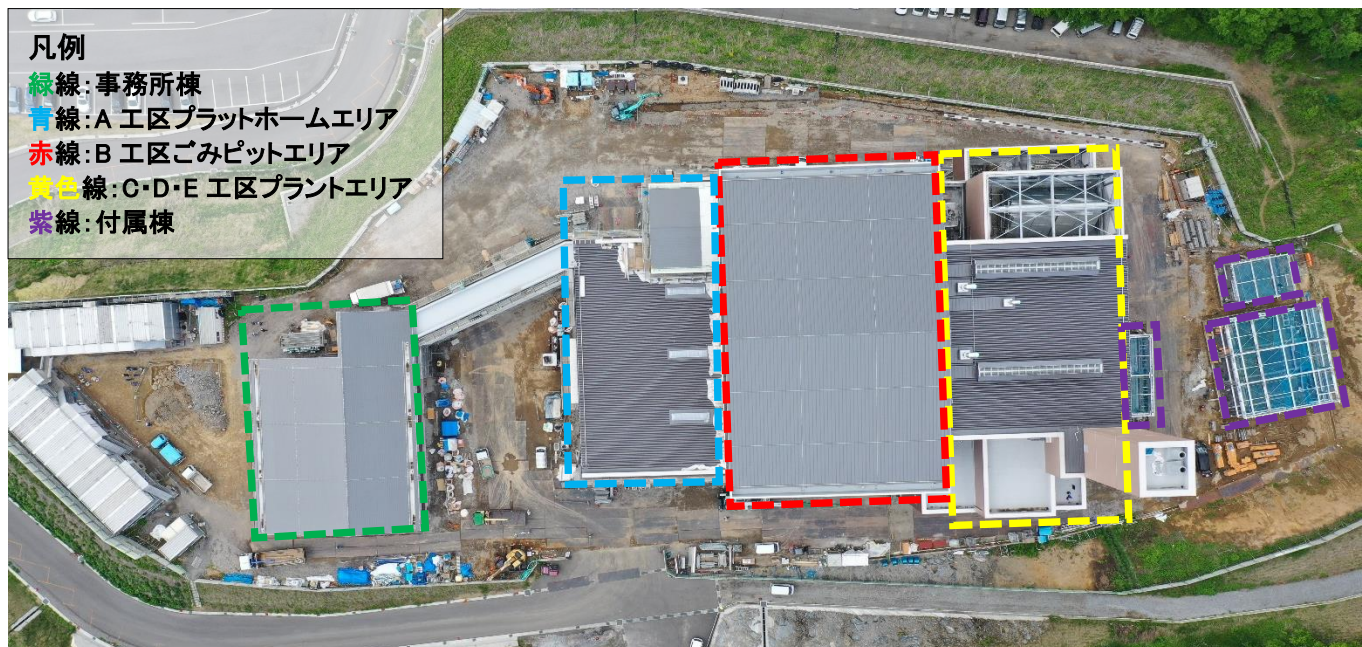

◆全景写真：令和2年5月27日



◆事務所棟・ごみピットエリア【B工区】

事務所棟では研修室等の内装工事を継続しています。B工区では受変電室等で受電に向け受変電設備の調整、試験を行っています。

【写真①】研修室：内装工事



【写真②】受変電室：受変電設備調整



◆炉室エリア【C工区】・洗車棟

炉室エリアでは配管・保温工事を継続しています。各付属棟では鉄骨建て方工事を行いました。

【写真③】C工区：配管・保温工事



【写真④】洗車棟：鉄骨建て方工事



◆今後の予定【6月】

- ・ 建築工事：工場棟・事務所棟ともに、内装工事、一般機械設備工事、電気設備工事を継続して行います。付属棟では屋根・外壁工事を開始します。
- ・ プラント工事：引き続き、各種工事（配管・保温・電気計装 等）を継続します。また、受電後には試運転を開始し、各機械の点検、単体調整を行います。
