

新クリーンセンター建設状況について

平成 30 年 12 月 3 日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

◆11 月末現在の進捗状況【工事進捗率：11.45%】

【土木建築工事・プラント工事】工場棟

B 工区（ごみピットエリア）は、継続して柱・壁の配筋・型枠・コンクリート打設作業を行っています。


C・D 工区は、11 月より 1 階部分に配置する機械を搬入し、据付・調整を行い、焼却炉やボイラ等を設置するためのプラント架構（柱と梁で床などを支える構造のこと）の建て方工事が始まりました。

引き続き、環境に配慮し安全、安心な工事の進捗に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

【工事現場：配置・工区図】 「写真撮影方向：➡」



【ドローン撮影：平成 30 年 11 月 19 日】

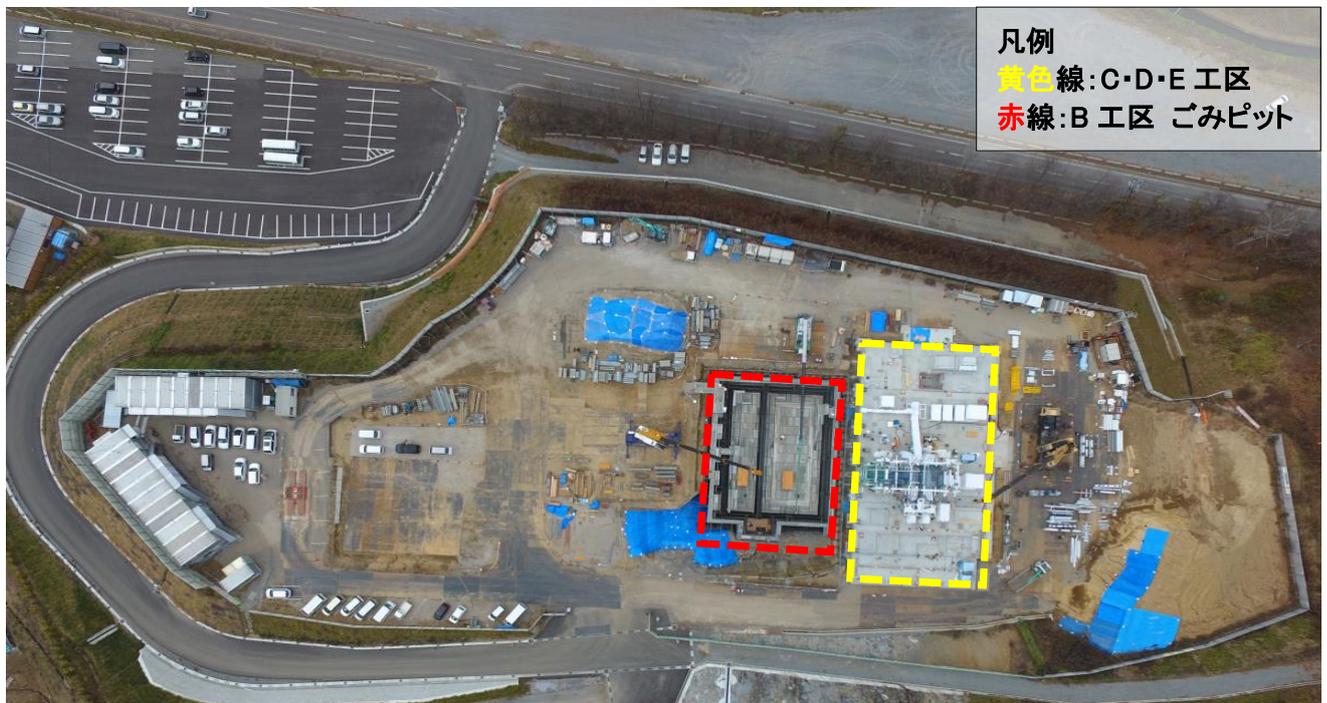

◆全景写真：平成 30 年 11 月 24 日



◆ごみピットエリア【B工区】

ごみピット壁・柱のコンクリート打設時は、初期硬化時の凍結防止、落ち葉など飛散物の混入防止のためシート養生を行うなど品質対策を徹底しました。

【写真①】



【写真②】



◆炉室・灰処理エリア【C・D工区】

プラント架構の建て方工事では、高所（約10m）作業が主となるため、一層の墜落防止対策や安全点検を強化し作業を行っています。

【写真③】



【写真④】



◆今後の予定【12月】

- ・ B工区は、ごみピット外壁廻りの仮設（山留・足場）の撤去、埋戻しを行います。
- ・ C・D工区は、機械の据付、プラント架構の建て方を継続していきます。

以上
